

Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագիր

Բաղադրիչ 1

**Վերջնական բնապահպանական և սոցիալական գնահատման
թերթիկ**

Միկրոծրագրի անվանումը՝ Գետահովիտ համայնքի արտաքին ջրագծի և
աղբյուրակապերի կառուցում

Միկրոծրագրի համարը՝ AFT-TV-04

Մշակվել է արդյոք Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլան՝

Այո + Ոչ _____

ԲՍԿՊ-ում նկարագրված են արդյո՞ք հնարավոր բոլոր ազեցությունները և դրանք
մեղմացնելու համապատասխան միջոցառումները:

Այո + Ոչ _____

Վերջնական բնապահպանական և սոցիալական գնահատման եզրակացությունը

Եզրակացություն	
Միկրոծրագիրը մերժվել է	Ենթածրագիրը հաստատվել է (բնապահպանական և սոցիալական գնահատումը ավարտվել է)
	+

ԲԱԺԻՆ Ա : ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԾՐԱԳԻՐ ԵՎ ՏԵՂԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ	
Երկիր	Հայաստանի Հանրապետություն
Ծրագրի անվանումը	Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման
Ծրագրի աշխատանքների նկարագիր	AFT-TV-04, Գետահովիտ համայնքի արտաքին ջրագծի և աղբյուրակապերի կառուցում
Ինստիտուցիոնալ համաձայնագրեր (ՀԲ)	Իջևան համայնք, Տավուշի մարզ
Իրականացման համաձայնագրեր (ՀՀ)	Գետահովիտ գյուղի խմելու-կենցաղային կարիքների համար ներկայումս անհրաժեշտ է 15.51/վրկ ջրաքանակ, որը իրենից ներկայացնում է առավելագույն օրվա միջին վայրկենական ծախսը: Նախատեսվող և գործող աղբյուրների գումարային ելքը հասնում է մինչև 12/վրկ-ի, որը էականորեն կբարելավում է գյուղի ներկայիս ջրապահանջը: Համաձայն նախագծման առաջադրանքի անհրաժեշտ ջրապահանջը լրացնելու համար նախատեսվել է կապտաժավորել Քամուտ և Սառնաղբյուր կոչվող տարածքների աղբյուրները: Առաջինի ելքը, համաձայն հիդրոտեկրաքանական եզրակացության գնահատվում է 3,1/վ, իսկ երկրորդ խումբ աղբյուրներինը 2 /վրկ: Այդ նպատակով նախատեսվում է յուրաքանչյուր տեղամասում կառուցել 3 ջրընդունիչ կառուցվածք: Ընդհանուր թվով վեց ջրընդունիչներից չորսը իրենցից ներկայացնում են բետոնյա ջրհավաք պատեր լցված ֆիլտրող շերտերով, մյուս երկուսը ունեն նույն կառուցվածքը, բացի այդ հավաքող պատին հարակից նախատեսված է թաց խուց ջրի հավաքման համար, ինչպես նաև փականային հանգույցների համար չոր խուց: Նշված ջրաղբյուրների տարածքում նախատեսվում է կառուցել սանիտարական պահպանման գոտու ցանկապատ՝ մետաղական խողովակ-հենարաններով և փշալարով: Նախատեսվել է նաև կառուցել նոր ջրատար «Քամուտ»-ից մինչև «Սառնաղբյուր» աղբյուրակապի տարածք (Ջրընդունիչ 6-ի թաց խուց) այնուհետև ջրատար մինչ Գետահովիտ գյուղի գոյություն ունեցող 460մ3 ծավալով ՕԿՁ: Ջրատարերի առանձին հատվածները, կախված հիդրավիկայից, երկրաբանական պայմաններից և աշխատանքի կազմակերպման հնարավորություններից նախատեսվում են կառուցել OD90 PN10, OD90 PN16 պոլիէթիլեն L=10968.5մ և Dn89x4.5 պողպատե L=6487մ խողովակներից ուժեղ հակակորոզիոն մեկուսացումով: Ջրատարի վրա բոլոր անհրաժեշտ տեղերում նախատեսվում է տեղադրել օդահեռ և թողարկ փականային հորեր՝ 57 հատ: Ջրատարի վրա նախատեսվել է 6 հատ մարիչ հորեր՝ ապահովելով ջրատարում թույլատրելի ճնշումները: Ընդհանուր առմամբ, շինարարական աշխատանքները կներառեն. • 5,10/վ հզորությամբ 6 ջրընդունիչ կառույցների կառուցում; • 17.455 /մ երկարությամբ և 87-90 մմ լայնությամբ խողովակաշարի կառուցում; • և պարիսպների կառուցում:

	Խողովակաշարի կառուցման համար որոշ տեղերում կհեռացվեն թփերը և չոր ծառերի երկար ճյուղերը: Ծրագիրը կիրականացվի Իջևան համայնքի ղեկավարության գրավոր թույլտվությամբ և «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի (Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն) պաշտոնական գրության համաձայն (տես Հավելված 7):		
Ծրագրի անվանումը	Ծրագրի ղեկավար Իվան Դրաբեկ	Երաշխիքների մասնագետ՝ Դարեջան Կապանաձե (բնապահպանական) Դեվիդ Զիջելավա (սոցիալական)	
Ծրագրի աշխատանքների նկարագիր	Իրականացնող կազմակերպություն՝ ՀՏՀՀ Ասյա Օսիպովա (բնապահպանական) Քնարիկ Գրիգորյան (սոցիալական)	Տեխնիկական վերահսկիչ Ալտերնատիվ ՍՊԸ	Կապալառու ԲԼԵՍԿ ՍՊԸ
ՏԵՂԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ			
Վերականգնվող տարածքի սեփականատեր կազմակերպության անվանումը	Տավուշի մարզի ջրային վարչություն		
Վերանորոգվող/կառուցվող կառույցի հասցեն և գտնվելու վայրը	Իջևան համայնք, Շիրակի մարզ		
Հողի սեփականատերը Ո՞վ է օգտագործում այդ հողը (ֆորմալ/ոչ ֆորմալ)	Սանիտարական գոտիների և Սառնաղբյուր տանող խողովակաշարի կառուցման համար առաջարկվող հողատարածքները պետական սեփականություն են և շահագործվում են «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի կողմից: Խողովակաշարերը կառուցվելու են հողային ճանապարհի երկայնքով: Սառնաղբյուր աղբյուրից մինչև գործող ՕԿՋ խողովակաշարի հատվածի կառուցման համար առաջարկվող հողամասը համայնքային սեփականություն է: Ճանապարհի և մասնավոր հողատարածքների (արոտավայրերի) միջև շինարարության ընթացքում մեքենաների և այլ սարքավորումների կայանման համար հասանելի է մոտ 4 մ լայնությամբ ազատ տարածք (Հավելված 3): Միկրոծրագրով կառուցապատման համար առաջարկվող հողատարածքները ֆորմալ կամ ոչ պաշտոնական կերպով չեն օգտագործվում մասնավոր նպատակներով: Առաջարկվող հողամասում մասնավոր շինություններ կամ այլ գույք չկան: Խողովակաշարը չի անցնի մասնավոր հողատարածքներով:		

Տվյալ ծրագրի վայրի շրջապատող ֆիզիկական և բնական միջավայրի նկարագրությունը	ՀՀ Տավուշի մարզի Գետահովիտ գյուղը գտնվում է Աղստև գետի ստորին հոսանքում՝ Իջևան քաղաքից 1 կմ հյուսիս: Այստեղ լանդշաֆտը լեռնային է՝ հարավ-արևմուտքից հյուսիս-արևելք ընդհանուր թեքությամբ (Քուռ գետին հարող հարթավայր): Գերակշռում են խոր ձորերը և լեռնոտ ցածր լանդշաֆտային տարածքները՝ ծածկված խիտ ու փարթամ բուսականությամբ անտառներով: Առաջարկվող ջրատարը կանցնի անտառային տարածքների 2 հատվածով՝ 5 կմ և 3 կմ, որի հետևանքով բուսական աշխարհի վրա աննշան ազդեցություն է սպասվում: Ելնելով նախագծային տվյալներից՝ ծառերը չեն տուժի, խողովակաշարի ուղեծիրը նախագծված է այնպես, որ խողովակաշարը հատի անտառային տարածքները այն վայրերում, որտեղ կարող են տուժել միայն թփեր և ծառերի ճյուղեր: Բայց ձեռնարկվելու են բոլոր միջոցները բուսականությանը հասցված վնասը նվազագույնի հասցնելու, ինչպես նաև դրա հետագա վերականգնման համար: Կլիմայական տեսակետից տարածքը պատկանում է տաք և չոր ամառներով և ցուրտ ձմեռներով տաք գոտուն: Կլիման մեղմ է, բարեխառն, տարեկան տեղումների միջին քանակը 484 մմ է, օդի նվազագույն ջերմաստիճանը՝ -17°C, առավելագույնը՝ $+37^{\circ}\text{C}$: Նկարագրված տարածքի երկրաբանական կառուցվածքում գերակշռում են կավե և հրաբխային-նստվածքային ապարները: Հանդիպում է նաև տուֆի ավազաքարեր և պորֆիրիներ: Տարածքի ստորերկրյա ջրերը սահմանափակվում են մեզոզոյան տուֆի ավազաքարերով, որոնք առաջանում են երկրի մակերևույթից 50 մ խորության վրա և բացվում են ռելիեֆի ստորին հատվածներում՝ աղբյուրների տեսքով: Քննարկվող տարածքը պատկանում է 8 բալանոց 1-ին սեյսմիկ գոտուն: Շինհրապարակը կազմակերպվելու է բնակավայրի բնակելի հատվածից հեռու: Շինհրապարակի մոտակայքում գտնվող տներ չկան:
ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ	
Ազգային և տեղական օրենսդրություն և թույլտվություններ, որոնք պահանջվում են ծրագրում	ՀՀ հետևյալ օրենքները սահմանում են իրավական շրջանակը, որը կիրառելի է ծրագրի գործունեության համար. - Մթնոլորտային օդի պաշտպանության մասին ՀՀ օրենքի (1994) «Մթնոլորտային օդի պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի նպատակը ՀՀ կառավարության հիմնական սկզբունքների սահմանումն է՝ ուղղված մթնոլորտային օդի մաքրության

	ապահովմանը և օդի որակի բարելավմանը, օդի որակի վրա քիմիական, ֆիզիկական, կենսաբանական և այլ ազդեցությունների կանխարգելմանը և մեղմմանը: Սույն օրենքը նաև կարգավորում է արտանետումների լիցենզիաները և ապահովում է մթնոլորտային օդի աղտոտման առավելագույն թույլատրելի բեռներ / կոնցենտրացիաներ և այլն: Համաձայն այս օրենքի, կապալառուն պարտավոր է իրականացնել շինարարական աշխատանքներ, ինչպես նաև աղբի տեղափոխում և ժամանակավոր պահպանում փոշին և այլ արտանետումները նվազագույնի հասցնելու նպատակով: Թափոնների մասին ՀՀ օրենք (2004) Օրենքը իրավական և տնտեսական հիմք է տալիս թափոնների հավաքման, տեղափոխման, հեռացման, մաքրման, վերաօգտագործման, ինչպես նաև թափոնների բացասական ազդեցության կանխարգելման համար՝ բնական պաշարների, մարդու կյանքի և առողջության վրա: Օրենքը սահմանում է պետական լիազոր մարմինների, ինչպես նաև թափոնների արտադրող կազմակերպությունների դերն ու պարտականությունները թափոնների կառավարման գործընթացներում: Համաձայն այս օրենքի, շինարարական գործունեությունից առաջացած թափոնները պետք է վերամշակվեն ըստ անհրաժեշտության կամ տեղահանվեն նշանակված վայրերում: Ընտրված վայրերում շինարարական թափոնների և ավելցուկային նյութերի հեռացումը պետք է գրավոր հաստատվի համայնքապետարանի կողմից: Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին ՀՀ օրենք (2014) Օրենքը սահմանում է գործունեության տեսակը, որը ենթակա է շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և շրջակա
--	---

	միջավայրի փորձաքննության: Ըստ սույն օրենքի, վերականգնման առաջարկվող աշխատանքները ենթակա չեն շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության պետական փորձաքննության: - «ՀՀ քաղաքաշինության մասին» օրենք (1998) Համաձայն ՀՀ օրենսդրության ծրագրի իրականացման համար պահանջվում են հետևյալ թույլտվությունները՝ ➤ Շինարարական թույլտվություն*** ➤ Շինարարական աղբի թափոնակույտման վայրի թույլտվություն ➤ Զրոգտագործման թույլտվություն
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈՄ	
Ե՞րբ և ո՞րտեղ տեղի կունենա հանրային քննարկումը	Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանը ներկայացվել է Հուլիսի 21-ին Գետահովիտի վարչական շենքում իրականացված հանրային քննարկման ընթացքում: Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանը կտեղադրվի ՀՏԶՀ-ի պաշտոնական կայքում (atdf.am) և համայնքի կայքում (www.amasia.am): Պլանավորված աշխատանքների վերաբերյալ տեղեկատվությունը կներկայացվի շինարարական հրապարակի մոտակայքում և համայնքապետարանի տեղեկատվական տախտակների վրա:
ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ	
Հավելված 1. Լուսանկարներ և քարտեզներ Հավելված 2. Թափոնների հեռացման թույլտվության պատճեն Հավելված 3. Համայնքի ղեկավարի գրությունը հողերի կարգավիճակի վերաբերյալ Հավելված 4. Զրոգտագործման թույլտվություն Հավելված 5. ԲՍԿՊ-ի վերաբերյալ հանրային քննարկման արձանագրություն Հավելված 6. Շինարարության իրականացման թույլտվություն Հավելված 7՝ «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի գրություն	

Շրջակա միջավայրի/սոցիալական ցուցանիշներ			
Արդյոք աշխատանքները կներառի/ կընդգրկի նշվածներից որեւէ մեկը	Գործունեություն/հիմնահարց	Կարգավիճակ	Խթանային գործողություններ
	1. Ջրագծի վերականգնում	[+] Այո [] Ոչ	Տես ստորեւ Բաժին Ա-ն
	2. Նոր շինարարություն	[+] Այո [] Ոչ	Տես ստորեւ Բաժին Ա-ն
	3. Կեղտաջրերի հեռացման առանձին համակարգ	[] Այո [+] Ոչ	Տես ստորեւ Բաժին Բ-ն
	4. Պատմական շենքեր եւ շրջաններ	[] Այո [+] Ոչ	Տես ստորեւ Բաժին Գ-ն
	5. Հողի ձեռքբերում	[] Այո [+] Ոչ	Տես ստորեւ Բաժին Դ-ն
	6. Վտանգավոր կամ թունավոր նյութեր	[] Այո [+] Ոչ	Տես ստորեւ Բաժին Ե-ն
	7. Ազդեցությունը անտառների եւ/կամ պաշտպանված տարածքների վրա	[+] Այո [] Ոչ	Տես ստորեւ Բաժին Զ-ն
	8. Բժշկական թափոնների կարգավորում/կառավարում	[] Այո [+] Ոչ	Տես ստորեւ Բաժին Է-ն
	9. Երթևեկություն և հետիոտների անվտանգություն	[] Այո [+] Ոչ	Տես ստորեւ Բաժին Ժ-ն
	Թ. Սոցիալական ռիսկ	[+] Այո [] Ոչ	Տես ստորեւ Բաժին Ը-ն

ՄԱՍ Գ: ՄԵՂՄԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՑՈՒՑԱՆԻՇ	ՄԵՂՄԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ
Օ. Ընդհանուր պայմաններ	Ծանուցում եւ աշխատողների անվտանգություն	➤ Շինարարական եւ շրջակա միջավայրի տեղական տեսչություններին տեղեկացվել է առաջիկա աշխատանքների մասին: ➤ Հանրությանը համապատասխանաբար տեղեկացվել է աշխատանքների վերաբերյալ (այդ թվում^ա տեղանքի աշխատանքների վերաբերյալ): ➤ Ձեռք են բերվել իրավաբանական բոլոր թույլտվությունները շինարարության եւ/կամ վերականգնման համար ➤ Կապալառուն պաշտոնապես համաձայն է, որ ողջ աշխատանքն իրականացվի ապահով եւ սահմանված կարգով, նվազեցնելով ազդեցությունները հարեւան բնակավայրերի եւ միջավայրի վրա: ➤ Աշխատակիցները պետք է համապատասխանեն միջազգային լավ փարձին (մշտապես սաղավարտներով, անհրաժեշտ դիմակներով եւ անվտանգ ակնոցներով, ամրագոտիներով եւ ապահով երկարաճիտ կոշիկներով): ➤ Տեղանքների համապատասխան ցուցասյուները պետք է տեղեկացնեն աշխատողներին հետեւել հիմնական կանոններին:
Ա. Ընդհանուր շիրարարական պայմաններ	Օդի որակ	➤ Շինարարական աղբը պետք է պահվի վերահսկվող գոտում եւ ցողվի ջրով^ա շինարարական փոշին նվազեցնելու համար: ➤ Շրջակա միջավայրը (մայթեր, ճանապարհներ) պետք է ազատվեն շինարարական աղբից^ա փոշին նվազեցնելու համար: ➤ Տեղանքում բաց վիճակում չպետք է այրել շինարարական թափոններ: ➤ Տեղանքներում չպետք է լինի չափից դուրս շատ չօգտագործվող շինարարական փոխադրամիջոցներ:
	Աղմուկ	➤ Շինարարության աղմուկը պետք է սահմանափակվի թույլատրելի սահմաններում: ➤ Աշխատանքների ընթացքում գեներատորների շարժիչները, օդային կոմպրեսորները եւ մյուս մեխանիկական սարքավորումները պետք է փակվեն, իսկ սարքավորումը պետք է տեղադրվի բնակելի վայրերից հնարավորինս հեռու:
	Ջրի որակ	➤ Տեղանքում պետք է սահմանվեն էոզդիայի եւ նստվածքի վերահսկման միջոցառումներ, ինչպես օրինակ^ա հնձած խոտի հակեր և/կամ տիղմային ցանկապատեր, որոնք կանխում են հեռացնել նստվածքը տեղանքից եւ մեծ խտության պատճառ են

	Թափոնների կառավարում	հանդիսանում մոտակա վտակներում եւ գետերում: ➤ Թափոնների հավաքման եւ հեռացման ու տեղանքները պետք է հատկացվեն բոլոր տեսակի թափոնների համար, որոնք ակնկալվում են շենքերի քանդման եւ շինարարական աշխատանքներից: ➤ Շենքերի քանդման թափոնները պետք է առանձնացվեն եւ տեսակավորվեն համապատասխան կոնտեյներներում: ➤ Շինարարական թափոնը պետք է հավաքվի եւ համապատասխանաբար հեռացվի հավաքողների կողմից: ➤ Թափոնների հեռացման մասին տվյալները պետք է որպես ապացույց պահպանվեն համապատասխանաբար մշակված կառավարման համակարգում:
Է. Ազդեցության ենթարկված անտառներ, խոնավ տարածքներ և/կամ պահպանվող տարածքներ	Պաշտպանություն	➤ Գործունեության անմիջական հարևանությամբ գտնվող բոլոր ճանաչված բնական միջավայրերը, խոնավ տարածքները և պահպանվող տարածքները չեն վնասվի կամ շահագործվի, բոլոր անձնակազմին խստիվ կարգելվի որսը, կեր որոնելը, անտառահատումները կամ այլ վնասաբեր գործունեություն: ➤ Շինարարական գործունեության շրջակայքում գտնվող մեծ ծառերի հետազոտություն և գույքագրում պետք է կատարվի, խոշոր ծառերը պետք է նշվեն և պարսպապատվեն ցանկապատով, պաշտպանվեն դրանց արմատային համակարգը և խուսափեն ծառերի ցանկացած վնասից: ➤ Հարակից խոնավ տարածքները և առուները պետք է պաշտպանված լինեն շինհրապարակի արտահոսքից՝ համապատասխան էրոզիայի և նստվածքի վերահսկման հատկանիշով, որը ներառում է չսահմանափակվելով խոտի բալաներով և տիղմով ցանկապատերով: ➤ Հարակից տարածքներում, հատկապես ոչ պահպանվող տարածքներում, չլիցենզավորված վարկահանքեր, քարհանքեր կամ աղբավայրեր չեն լինի:
Թ. Սոցիալական ռիսկեր	Հասարակայնության հետ կապերի կառավարում	Շինարարն ունի տեղական հետադարձ կապն ապահովող անձնավորություն ով նշանակված է ապահովելու տեղական բնակչության հետ հաղորդակցությունը և առաջարկություններ/բողոքներ ստանալը ա. Տեղական բնակչության հետ իրականացվել են խորհրդակցություններ նույնականացնելու և ակտիվ ձևով կառավարելու տեղական բնակչության և դրսից բերված աշխատուժի միջև ծագող հնարավոր կոնֆլիկտները բ. Կապալառուն բարձրացնում է տեղական բնակչության

		իրազեկվածությունը սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդությունների ռիսկերի վերաբերյալ, որոնք կարող են կապված լինել դրսից բերված աշխատուժի հետ գ. Բնակչությունը համապատասխան դեպքերում իրազեկված է շինարարական աշխատանքների ժամանակացույցի վերաբերյալ, ծառայությունների կասեցման, երթևեկության տարանցիկ ուղիների և ավտոբուսների ժամանակավոր կանգառների, պայթեցման և քանդման աշխատանքների, դ. Շինարարական աշխատանքները չեն իրականացվում գիշերային ժամերին: Անհրաժեշտության դեպքում գիշերային աշխատանքների համար կկազմվեն պատշաճ ժամանակացույցեր և համայնքները պատշաճ կերպով կտեղեկացվեն այդ մասին, այնպես որ հնարավոր կլինի ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցառումներ: Ցանկացած ծառայության դադարեցումից նվազագույնը հինգ օր առաջ (ներառյալ ջուր, էլեկտրոէներգիա, հեռախոս, ավտոբուսային երթուղիներ), համայնքի անդամները իրազեկվում են նախօրոք ծրագրի վայրում, ավտոբուսային կազառներում և ազդակիր տներում հայտարարությունների միջոցով:
	Աշխատուժի կառավարում	ա. Աշխատանքային ճամբարները կտեղակայվեն տեղական համայնքներից հեռու, այնքանով որքանով դա հնարավոր է: բ. Աշխատանքային ճամբարների տեղակայումը և գործառնությունը կիրականացվի հարևան համայնքների հետ խորհրդակցությունների արդյունքում գ. Կապալառուն կվարձի այնքանչորակավորված և կիսաորակավորված աշխատողներ տեղական համայնքներից, որքան հնարավոր է: Տեղական բնակչության ներգրավումը բարձրացնելու նպատակով կիրականացվեն թրեյնինգներ այնտեղ որտեղ այն տեղին է և երբ անհրաժեշտ է: դ. Համապատասխան սանիտարական հարմարությունների (զուգարաններ և լվացարան) առկայություն շինարարության վայրում՝ ներառյալ տաք և սառը հոսող ջրի, օճառների և ձեռքերը չորացնելու հարմարություններ: ե. Կապալառուն բարձրացնում է աշխատողների իրազեկվածությունը տեղական բնակչության հետ հարաբերությունների կառավարման, վարքագծի կանոնների վերաբերյալ համաձայն միջազգային գործելակերպին և խստորեն հետևում է դրանց, ներառյալ աշխատողներին աշխատանքից հեռացնելը և համապատասխան ֆինանսական տույժերի նշանակումը:

ԲՆԱԴԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ ՊԼԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՓՈԽԼԵՐՈՒՄ

Գործունեություն	Ինչ (պարամետր է վերահսկվելու)	Որտեղ (է պարամետր ը վերահսկվել ու)	Ինչպես (է պարամետր ը վերահսկվել ու)	Երբ (սահմանել հաճախականությունը /կամ շարունակականությունը)	Ինչու (է պարամետր ը վերահսկվել ու)	Ով (է պատասխան ատու պարամետրի վերահսկման համար)
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽԼ						
1. Շինարարական նյութերի մատակարարում	Շինարարական նյութերի գնումը արտոնագրված մատակարարներից	Մատակարարների գրասենյակներ և պահեստներ փոխառության վայրերի	Փաստաթղթերի ստուգում Նյութերի որակի ստուգում	Նյութերի մատակարարման վերաբերյալ համաձայնագրերի ստորագրման ընթացքում	Ապահովել շինարարության տեխնիկական որակը Պաշտպանել մարդկանց առողջությունը և միջավայրը	ՀՏՀՀ Տեխնիկական վերահսկողություն
2. Շինարարական նյութերի և թափոնների տեղափոխում Շինարարական սարքավորումների տեղաշարժ	Շինարարական տեխնիկայի և մեքենաների տեխնիկական վիճակը Բեռնատար մեքենաների և բեռի համապատասխանություն, բաց մեքենաներով տեղափոխվող բեռի ծածկում Շինարարական տրանսպորտային	Շինարարական նյութերի և շինարարական թափոնների փոխադրման համար երթուղիներ	Շինարարական վայրին հարակից ճանապարհներում դիտազննում ներառյալ նախապես համաձայնեցված տեղափոխության երթուղիները	Չնախատեսված ստուգումներ աշխատանքային ժամերին	Խուսափել փոշուց և կոշտ թափոններից օդի և ճանապարհների աղտոտվածությունից Նվազեցնել ճանապարհային խոչընդոտները	ՀՏՀՀ, Ճանապարհային ոստիկանություն Տեխնիկական վերահսկողություն

	միջոցների և մեքենաների տեղափոխում սահմանված երթուղիներով					
3. Շինարարական սարքավորումների պահպանություն	- մեքենաների և շինտեխնիկայի լվացում շինհրապարակից դուրս կամ բնական հոսքերից առավելագույն հեռավորության վրա. - շինհրապարակից դուրս կամ նախապես որոշված սահմանափակված տարածքում շինարարական սարքավորումների վառելիք լցոնում կամ յուղում:	Շինարարական հրապարակ	Իրականացման հսկողություն	Պատահական այցելությունների աշխատանքային ժամերին	- խուսափել սարքավորումների շահագործման պատճառով ջրի և հողի աղտոտումից նավթամթերքներից. - հրդեհի դեպքում ժամանակին տեղայնացնել և նվազեցնել սպասվող վնասը:	ՀՏՀՀ Տեխնիկական վերահսկող

4. Շինարարական թափոնների կուտակում	- Շինարարական աղբի ժամանակավոր պեհաստավորում հատուկ հատկացված տարածքներում - Իներտ և վտանգավոր թափոնների ժամանակավոր պահեստավորում նշանակված վայրերում Աղբի՝ ժամանակին տեղափոխում Ֆորմալ ձևավորված աղբավայրեր	Շինարարության վայր և հիմք (եթե կիրառելի է) Աղբի տեղափոխության և համար ձևավորված աղբավայրեր	Ստուգաթերթեր Դիտագննում	Ընթացքում և աշխատանքային ժամերի	Խուսափել շրջակա միջավայրի աղտոտումից	ՀՏԶՀ, Տեխնիկական վերահսկող
5. Կենցաղային աղբի առաջացում	-Աղբարկղերի ապահովում, -Թափոնների կանոնավոր տեղափոխության շուրջ տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ համաձայնություն	Շինարարական հրապարակ	Դիտագննում	Շինարարության ամբողջ ժամանակահատվածում	Խուսափել կենցաղային աղբի պատճառով հողի եւ քրի աղտոտվածությունից,	ՀՏԶՀ
6. Աշխատանքի անվտանգություն	-Աշխատողներին հատուկ համազգեստի և պաշտպանական միջոցների - Շինարարական սարքավորումներ	Շինարարական հրապարակ	Գործունեության ստուգում	Շինարարության ամբողջ ժամանակահատվածում	Նվազեցնել պատահարների հավանականությունները	ՀՏԶՀ Տեխնիկական վերահսկող

	ի շահագործման և պաշտպանիչ համազգեստի օգտագործման կանոնների խիստ պահպանում - աշխատանքի անվտանգության ուսուցման և հրահանգների գրառումների առկայություն - Աշխատանքի վայրում առաջին օգնության բժշկական փաթեթների և կրակմարիչների առկայություն - Արտակարգ իրավիճակների ծառայությունների (բժշկական, հրդեհային) կոնտակտային տվյալներ, որոնք տեղադրված են աշխատանքային վայրի տեղեկատվական տախտակին					
7. Հողային աշխատանքներ	Հողի վերին շերտի վերամշակման համար հողի հեռացում և ժամանակավոր պահեստավորում - Պեղված հողի	Շինհրապարակ	Գործողությունների զննում	Հողային աշխատանքների ընթացքում	Բուսականության կորստի սահմանափակում հողային աշխատանքների արդյունքում և մասնիկներով վերգետնյա ջրամբարների աղտոտումը նվազագյունի հասցնել Նվազեցնել ստորգետնյա և վերգետնյա ջրերի աղտոտումը	ՀՏԶՀ ՏՎԿ

	Ժամանակակից պահպանումը որոշված վայրերում. - Անհրաժեշտությամբ դեպքում պեղված հողի պահպանում և ավելցուկային զանգվածը գրավոր հաստատված վայրեր տեղափոխություն				հողով:	
8. Իներտ նյութերի արդյունահանում	- գոյություն ունեցող մատակարարներ ից իներտ նյութերի գնում, եթե այդպիսի հնարավորություն կա - իներտ նյութերի արտադրության լիցենզիայի ստացում և լիցենզիայի խիստ համապատասխանություն - քարհանքերի տեռասավորում, շահագործվող տարածքների վերալիցքավորում և լանդշաֆտի հետ	Իներտ նյութերի քարհանքեր	Փաստաթղթերի ստուգում Գործողությունների ստուգում	Քարհանքերում պեղումների և մեխորացիայի ընթացքում	- Սահմանափակել լանջերի էրոզիան և լանդշաֆտի վնասները - Սահմանափակել գետերի ափերի էրոզիան, ջրի հոսքի կշռված մասնիկներով աղտոտումը և ջրային կյանքի խանգարումը	ՀՏՀՀ Տեխնիկական վերահսկողություն

	ներդաշնակեցում - ջրի հոսքից դուրս մանրախիճ փորել, ջրի հոսքի և պեղումների տարածքի միջև լեռնաշղթաները բաժանելու կազմակերպում, տրանսպորտային միջոցների և մեքենաների կողմից դեպի ջրային ռեսուրսներ մուտքի արգելում					
9. Անտառային բուսականության մաքրում խողովակաշարի անցկացման համար	Անտառային բուսականության վնասում	Շինարարարական հրապարակ	Գործողությունների վերհսկում Փաստաթղթերի ստուգում	Հողային աշխատանքների ընթացքում Քարհանքերում պեղումների և վերականգնման ժամանակ	Կանխել օդափոխության ավելորդ վնասը՝ սահմանափակելով շինարարական տրանսպորտային միջոցների և մեքենաների տեղաշարժը փոխադրման նշանակված երթուղիներով, ձեռնարկել տեղում շինանյութերի և ապրանքների պահեստավորում նշանակված վայրերում և նվազագույն պարագծում, սահմանափակել շինարարական աշխատանքները նշանակված և սահմանազատված շինհրապարակով:	Գետահովիտ վարչական միավորի աշխատակազմ «Հայանտառ» ՊՈԱԿ
10. Պատահական գտածոներ	- Աշխատանքների դադարեցում՝ անմիջապես փոփոխության գտածոների	Շինհրապարակ	- Պատահական գտածոների գնում. - Ներկայացված	Շինարարության ամբողջ ընթացքում	Համոզվել, որ մշակութային հուշարձանը չի վնասվել շինարարական աշխատանքների ընթացքում	ՀՏՀՀ ՏՎԿ Հուշարձանների և պատմական

	բախումից հետո. - Պաշտոնական հաղորդակցություն ՀՀ հուշարձանների և պատմական վայրերի պաշտպանության գործակալության հետ - պատահական գտածոների հետ. - Անհրաժեշտ պեղումների և տեղանքների պահպանման ուղղությամբ ձեռնարկված ժամանակին պայմանավորված ություններ		փաստաթղթերի ստուգում			վայրերի պաշտպանության գործակալություն
11. Պատրաստվածությունը COVID-19-ին շինարարական հրապարակում	- Աշխատատեղում ձեռքի լվացման միջոցների ապահովում՝ հոսող ջրի, ձեռքի օճառի, ձեռքի ակոհոլային հիմքով մաքրող միջոցների և ձեռքի չորացման սարքերով բավարար պաշարներով - Աշխատավայրի մուտքի կարգի սահմանում և բժշկական ստուգումները - Ընդհանուր	Շինարարարական հրապարակ	Գործողությունների վերահսկում	Աշխատանքների ամբողջ ընթացքում	Նվազեցնել COVID-19 համավարակի ռիսկերը շինարարական հրապարակում	ՀՏՀՀ Տեխնիկական վերահսկողություն


	օգտագործման սենյակների, զուգարանների, սարքավորումների, գործիքների և թափոնների կանոնավոր ախտահանում; - Աշխատանքային պրակտիկա՝ աշխատողների միջև շփումը նվազեցնելու կամ նվազագույնի հասցնելու համար - Դիմակների և այլ համապատասխան անվտանգության միջոցների տրամադրում ծրագրի բոլոր աշխատողներին՝ շինարարական հրապարակի մուտքի մոտ:					
12. Շինհրապարակների վերամշակումը և կանաչապատումը	Անհրաժեշտության դեպքում, շինհրապարակի և մշտական մուտքի ճանապարհների և տարածքի կանաչապատում և ավարտական մաքրում	Շինհրապարակ և մուտքի ճանապարհներ	Զննում և փորձաքննություն	Շինարարության վերջնական փուլում	Նվազագույնի հասցնել լանդշաֆտի գեղագիտական արժեքի կորուստը շինարարական գործունեության արդյունքում	ՀՏԶՀ Տեխնիկական վերահսկող
13. Գործունեություն մասնավոր սեփականության և այլ	- Շինարարական տրանսպորտային միջոցների և	Մասնավոր սեփականության հարևանությամբ	Զննում և փորձաքննություն	Շինարարության ամբողջ ընթացքում	Նվազեցնել մասնավոր սեփականությանը վնասի հասցման հավանականությունը:	ՀՏԶՀ Տեխնիկական վերահսկող


գույքի կողքին	մեքենաների կայանման արգելում շինհրապարակից դուրս - Շինհրապարակի շուրջ հետիոտների և տրանսպորտային միջոցների տեղաշարժի արգելք թույլ չտալ՝ շինանյութերի/թափոնների կուտակման/թափման պատճառով - Կապալառուի անձնակազմի կողմից շինհրապարակի շրջակայքում մասնավոր հողատարածքներ ի և/կամ այլ գույքի նկատմամբ ոտնձգություն թույլ չտալ	իրականացվող աշխատանքներ	ն		Բացառել մասնավոր սեփականության վրա սեփականատիրոջ կամ օգտագործողի իրավունքների ժամանակավոր կամ մշտական խախտումը:	
14. Բողոքների լուծման մեխանիզմի գործածում	Ենթածրագրի վերաբերյալ բողոքների կամ հարցերի վերաբերյալ	Շին հրապարակ	Փորձաքննություն ն	Շինարարության ամբողջ ընթացքում	Բողոքի քննարկում և լուծում 2 շաբաթվա ընթացքում: Խնդրի լուծման ծախսողման դեպքում նախարարության կամ իրականացնող	<ՏԶ< Տեխնիկական վերահսկող

	հանրային իրավունք: Դիմում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարին (համայնքային իշխանություններին): Բողոքների համակարգողի նշանակում (բողոքների ստացում, վերանայում և բացատրություն, բողոքների գրանցքում մատյանում և փորձ լուծել դրանք ոտքի վրա): Բողոքատուն կարող է դիմել անմիջապես ՀՏՀՀ՝ թեժ գիծ ծառայության (010 24 01 59), փոստային նամակի (Երևան 0037, Կ. Ուլենցի 31), էլեկտրոնային նամակի (support@atdf.am). կամ ՀՏՀՀ-ի կայքում տեղադրված գործիքի միջոցով				կազմակերպության մակարդակում, ԾԱԵԱ-ն կարող է դիմել դատարանին որոշման կայացման համար՝ ՀՀ օրենսդրության համաձայն	
--	--	--	--	--	--	--

	(http://atdf.am/hy/Home/ContactUs):					
ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՓՈԻԼ						
1. Ջրամատակարարման սահուն շահագործման ապահովում	Ջրամատակարարման խողովակաշարի մշտական սպասարկում	Ջրամատակարարման ցանց	Վիզուալ մշտադիտարկում	Ամբողջ օրվա ընթացքում	Ջրաօգտագործողների որակյալ սպասարկման ապահովում	Գետահովիտ վարչական միավորի աշխատակազմ
2. Ջրամատակարարման համակարգի շահագործում	Գյուղին մատակարարվող խմելու ջրի որակը համապատասխանում է խմելու ջրի որակի ազգային չափանիշներին	Ջրամատակարարման սխեմա	Ջրի նմուշների հավաքում և դրա որակի գործիքային ստուգում սահմանված պարամետրերով	Շահագործման ընացքում	Ջրածին հիվանդությունների առաջացման կանխում	ՀՀ հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն

Հավելված 1՝ Լուսանկարներ և քարտեզներ

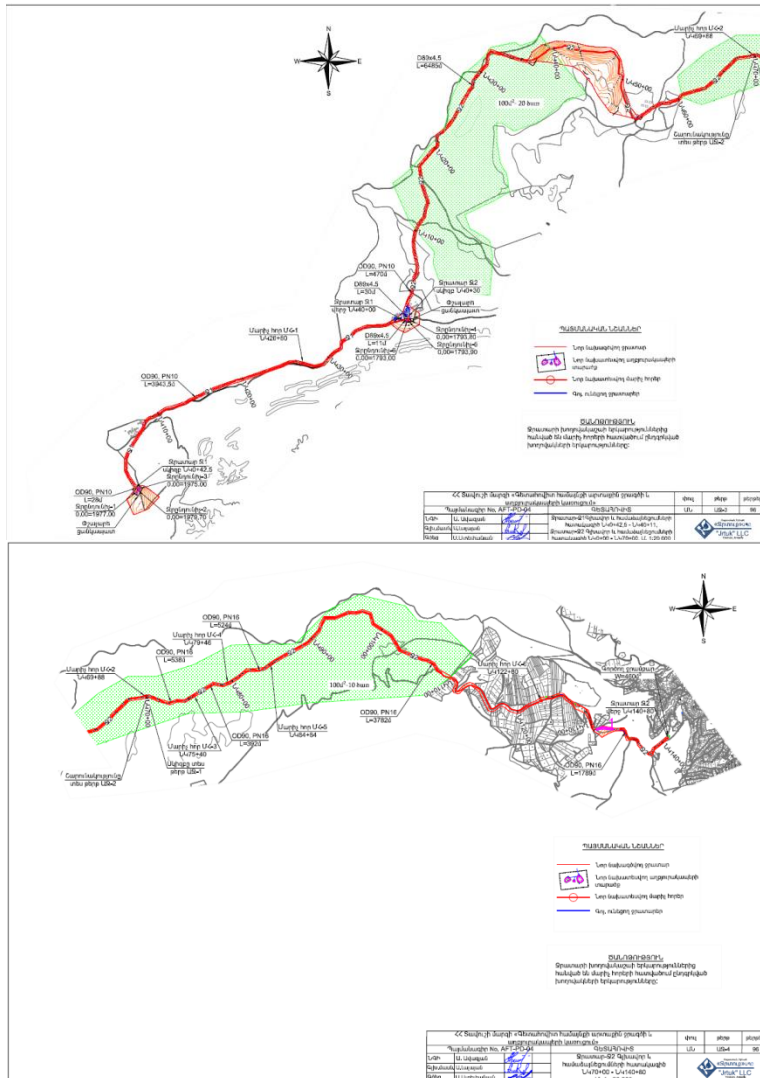

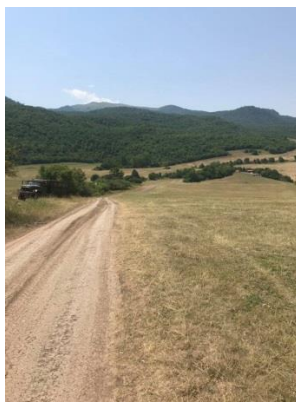

Հավելված 2՝ Թափոնների հեռացման համաձայնության պատճեն


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՏՎԱԴՈՒԹԻ ՄԱՐԶ ԻՔԵԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Իջևան համայնք
ք. Իջևան, Երևանյան 6, Հեռ. (0263) 42138, govastat@icj.gov.am
N 1888, 20 հունիս 2022 թ.

«ՋԵՂՏՈՒՔ» ՍՊԸ
ՏՆՕՐԵՆ Ա. ԱՎԱԳՅԱՆԻՆ

ՏԵՂԵԿՄԱՔ

Հարգելի պարոն Ավագյան,
Հայրենում եմ Ձեզ, որ ՀՀ Տավուշի մարզի Գետառիվիտ բնակավայրի
ջրհեղձակների և ջրատարի կառուցման ժամանակ
1. Առաջադաս շինարարական աղբը կարելի է տեղափոխել 5.0 կմ հեռավորության
վրա գտնվող աղբավայր:
2. Անիդատեղա փափուկ գուննաղ կարելի է բերել 5.0 կմ հեռավորությունից:

ԳԵՏԱՐՈՒՄԻ ՔՆԱՎԱԿԱՅՐԻ ՎԱՐՉԱՎԱՆ ԴԵՎԱՆՈՒՄԻ ՂԱԶԱՐՅԱՆ



Խաթ. 1.26 կարգի մասնագիտ. Դեպարտիտ ինժեներ/ Թ. Մանան
2023.07.28

Հավելված 3՝ Համայնքի ղեկավարի գրությունը հողերի կարգավիճակի վերաբերյալ

«ՋԵՂՏՈՒՔ» ՍՊԸ-ի
տնօրեն Ա. Ավագյանին

Տեղեկանք

Հարգելի պ. Ավագյան

Հայրենում եմ Ձեզ, որ ՀՀ Տավուշի մարզի Գետառիվիտ համայնքի
ջրհեղձակների և ջրատարի կառուցման ժամանակ
համայնքի տնօրենարարական հանձնաժողով կողմից
Գետառիվիտ համայնքի ղեկավար

Ա. Դադարյան



ATF PG 04-Govastat 03/2022

Հավելված 4՝ Զրուցագրործման թույլտվություն (ամբողջական փաստաթղթին ծանոթանալու համար սեղմեք ստորև տեղադրված փաստաթղթի վրա)



IMG_20220929_0001.
pdf

Հավելված N 1
ՀՀ Կառավարության 2003 թվականի
մարտի 7-ի N 218-Ն որոշման


**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱՆ ՄԻՋԱԿԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**
ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

ՋՐՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ N0187 - 22

2-2- Ջ - Ս - Ն

ԻՋԵՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳԵՏԱԴՈՎԻՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐ

(Զրուցագրործողի անվանումը)
ՀՀ ՏՆՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ

ՀՀ ՇՐՋԱԿԱՆ ՄԻՋԱԿԱՅՐԻ	ԻՋԵՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵՎԱԿԱՐ
(Զրախիմ ռեսուրսների կառավարման ն)	(Զրուցագրործման թույլտվություն ստացողի)
ՆԱԽԱՐԱՐ Հ. ՄԻՍԻԳՅԱՆ (պաշտամունքային մարմնի ղեկավար)  Կ.Տ. Տրված է 29.09.2022 թ. Ուժի մեջ է մինչև 29.09.2025 թ.	Ա. ՃԱՂԱՐՅԱՆ (պաշտոնը ստորագրողը)  Որոշման հիմունքները Տրված է 29.09.2022 թ. Ուժի մեջ է մինչև 29.09.2025 թ.
Գործունեության ժամկետը երկարաձգված է մինչև _____ 20 թ.	
(Զրախիմ ռեսուրսների կառավարման ն)	(Զրուցագրործման թույլտվություն ստացողի)
պաշտամունքային մարմնի ղեկավար	պաշտոնը ստորագրողը

Հավելված 5՝ Հանրային քննարկման արձանագրություն

2022 թվականի Հուլիսի 21-ին Գետահովիտի վարչական շենքում իրականացվեց հանրային քննարկում՝ միկրոծրագրի Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանի շուրջ: Հանրային քննարկման մասին հայտարարությունը տեղադրվել է ՀՏՀ-ի պաշտոնական կայքում, Իջևան համայնքի կայքում և սոցիալական ցանցի էջում Հուլիսի 13-ին:

Ընդհանուր առմամբ, հանրային քննարկմանը մասնակցել է 21 մասնակից, որոնցից 12-ը՝ կին:

Գետահովիտի վարչական գրասենյակի ղեկավարը բացեց հանդիպումը և ներկայացրեց հանդիպման նպատակը և միկրոծրագրի հայեցակարգը:

ՀՏՀ սոցիալական մասնագետ Քնարիկ Գրիգորյանը ներկայացրեց միկրոծրագրով իրականացվելիք շինարարական աշխատանքների շրջանակը և Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանի մշակման նպատակը: Նա ներկայացրեց ակնկալվող 1 բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունները՝ մասնավորապես անտառային տեղանքի վրա սպասվող ազդեցությունները և մեղմացման միջոցառումները: Նշվեց, որ նախագծով ծառահատում չի նախատեսվում, իսկ այդպիսի անհրաժեշտության առաջացման դեպքում ծառահատում կարող է իրականացվել միայն «Հայանտառ ՊՈԱԿ-ի թույլտվությամբ: Համաշխարհային Բանկի քաղաքականությանը համապատասխան մեկ հատված ծառի փոխարեն պետք է տնկվի տասը ծառ: Հանրդիպմանը ներկա էր նաև «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի աշխատակից, որի հետ քննարկվեցին անտառածածկ տարածքների վրա ազդեցության ԲՄԿՊ-ով նախատեսված մեղմացման միջոցառումները:

Ներկայացվեցվեցին շրջակա միջավայրի վրա սպասվող այլ ազդեցությունները՝ ներառյալ շինարարական աղբի կուտակումը և տեղափոխումը, աղմուկի և փոշու ձևավորումը: Ներկայացվեցին նաև նախատեսվող անվտանգության միջոցառումները՝ ներառյալ շինհրապարակի վտանգավոր հատվածներում ժապավենների անցակցումը և երթևեկության կառավարումը, անվտանգության նշանների տեղադրման պահանջները: Աշխատանքային անվտանգության միջոցառումների մասին ևս խոսվեց՝ ներառյալ միատեսակ համազգեստ կրելու և պաշտպանիչ սարքավորումների անհաժեշտությունը, ինչպես նաև շինանյութերի մատակարարման և շինարարական սարքավորումների պահպանման պահանջները:

Հանդիպման մասնակիցներին ներկայացվեց ՄՆՏԶ ծրագրի բողոքների լուծման մեխանիզմը (ԲԼՄ): Ներկայացվեցին համայնքային ընդհանուր ժողովի ընթացքում ընտրված բողոքների տեղական համակարգողի (Ղազարյան Արթուրի) կոնտակտային տվյալները: Ներկայացվեցին բողոքների ներկայացման, քննության և վերանայման ընթացակարգերը: Նշվեց, որ ԲԼՄ-ի մասին տեղեկատվությունը լրացուցիչ կտեղադրվի Գետահովիտի վարչական գրասենյակի տեղեկատվական տախտակին և շինհրապարակի մուտքի մոտ տեղադրվող միկրոծրագրի տեղեկատվական տախտակին:

Խոսվեց ԲՍԿՊ-ով նախատեսված միջոցառումների իրականացման վերահսկման և մշտադիտարկման ընթացակարգերի մասին:

Հարց բարձրացվեց շինարարական աշխատանքների իրականացման ժամկետների վերաբերյալ:

Ք.Գրիգորյանը պատասխանեց, որ շինարարական և տեխնիկական վերահսկողության ընկերությունների գնումները պետք է կատարվեն երկամսյա ժամկետում, և եթե ուշացումներ չլինեն, շինարարական աշխատանքները կմեկնարկեն:

Հավելված 6՝ Շինարարության իրականացման թույլտվություն



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ, ԻՋԵՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ

Ռեզոլյուցիայի համաձայն

ԵՐԽԱՆԱԿԱՆ ՔՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

N 140 * 08 * ԱՌՅԱՆՔԵՐԻ 2022թ

Ցված է կառուցապատող ԻՋԵՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ -ին
Պատվաստման անի անձանց, պետական գրանցման վկայագրի համարը.

«ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ, ՀԱՄԱՅՆՔ ԻՋԵՎԱՆ, Բ. ԻՋԵՎԱՆ, ԵՐԽԱՆԱԿԱՆ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 6

Ֆիզիկական անի անձանց, ազգանունը, հայրն, ծնողների գրանցված վայրը՝

«ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ԳԵՏԱՀՈՎԻՑ ՔԱՎԱԿԱՍՏՐԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ՋՐԱԳԾԻ ԵՎ ԱՂՔՈՒՐԱԿԱՆԻ
ԿԱՌԱՌԵՐՈՒՄ», 3-ՐԴ ՈՒՍԱԿԱՌԱՌԵՐՈՒՄ ԱՍՏԻՃԱՆ

Նշանակումը, պաշտոնը, առարկաները, հասցեն, ընտանիքը, կրթական ցուցանիշները՝

օրվերի

ԿԱՌԱՌԵՐՈՒՄ

Հիմնարկական աշխատանքների կատարման, այդ թվում
/նոր կառուցման, վերակառուցման, վերանորոգման, ուժեղացման և այլն/ կառուցապատվող հողամասի
զվարճող հատակագծի վրա նշված ոչ իրենական կառույցների

տեղադրման համար:

Ոչ քան 66 ոչ իրենական կառույցների անվանումները՝

1. Օբյեկտի նախագծային գրաստաթղթերը՝

1/ ձևաթիվը են՝ ՄԵՎ ԱՆՆԱՍՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ/ ՓՈՒՐՈՎ

Նախագծային գրաստաթղթերի վայրը, նախագծային աշխատանքների

«ՀՐՏՈՒՔ» ԱԳՐ ՄԻՋԵՆՔԻՆ 16929, /ՄԻՑ. ՆԵՐՂԻՐ 16929-2, ԱՐՄԵՆ ԱՎԱԳՅԱՆ/

կողմից

կառուցապատի անվանումը, ընտանիքի համարը՝

2/ Առուցվել է Նմ/ « 10 » ԱՄՅԻՍԻ 2022թ N 10/157 փորձագիտական դրական եզրակացությունը

/եզրակացությունները/

ՊԱՐԶ

Ոչ քան փորձագիտության տեսակը՝

«ՀՀ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՐՏԱԳԵՐԱՏԵՍՆԱԿԱՆ ՓՈՂՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՓԲԸ, ՊԵՏ ՄԻՑ. N17074

կողմից

կամ

Ոչ քան փորձագիտության մարմնի անդամները՝ անվանումը, ընտանիքի համարը՝

Նախագիծը թողնվող պատասխանատու

կառուցապատի գրաշխավորագիրը

Ոչ քան նախագիծը թողնվող պատասխանատու կառուցապատի

գրաշխավորության պայմանագրի համարը՝

3/ սահմանված կարգով համաձայնեցվել են իրավասու մարմնի, օրենքով սահմանված այլ շահագրգիռ

մարմինների

հետ:

Ոչ քան մարմինների անվանումները և համաձայնեցման օրվերները՝

2. Հիմնարկական աշխատանքներն իրականացնել 24 ԱՐՄԱՆ ընթացքում՝

Ոչ քան շինարարական նորմատիվային տեղեկություններ

նորաշենք ավարտված շինարարական օբյեկտն ընդունող հանձնաժողովի աշխատանքի համար

նախատեսված ժամկետը:

2.1. Նախահովել օբյեկտի շահագրգիռման թույլտվության տրամադրումը՝

_____ ավարտական ակտի տրամադրումից _____ ամսվա ընթացքում

_____ ավարտական ակտի տրամադրումն օրը:

Ներառյալ ավարտված շինարարական օբյեկտն ընդունող հարձնաժողովի աշխատանքի համար
նախատեսվող ժամկետը:

3. Հրնարարության վարման մատյանը թագկացած է _____, էջից, կարված և դրոշմակնքված է

ԻԶԵՎԱՆՈՒ ՀԱՄԱՅՆՔԱԴԵՏԱԿՈՒՄ

կողմից

4. Նախագծային փաստաթղթերը փոփոխվել են *հղման մարմին անվանումը* *Հրաջեղում է N 1 հաշվեկազմի 108-րդ կետով նախատեսված*
դեպքերում _____ կողմից

և սահմանված կարգով համաձայնեցվել _____ և այլ

իրավասու մարմին

հղման մարմին անվանումը

շահագրգիռ մարմինները _____ հետ:

5. Հետևյալ պայմաններ

1/ կառուցապատողը նախքան շինարարության սկսելը, ինչպես նաև դրա ընթացքում, պարտավոր է հաջգնել զննարկողի փոխհատուցման համար համաձայնության գալ կառուցապատման հետևանքով վնասներ կրող տաղանթների հետ:

2/ շինարարության թույլտվությամբ սահմանված ժամկետներում կառուցապատումը չավարտելու դեպքում գրվում են N 1 հաշվեկազմի 128-128-րդ կետերով սահմանված պահանջները:

3/ *Հրաջեղում է N 1 հաշվեկազմի 86-րդ կետով նախատեսված դեպքերում*

սույն թույլտվությունը տրվել է սահմանված կարգով հաստատված «Նախագիծ» փուլի հիման վրա, որին հաջորդող «Աշխատանքային փաստաթղթեր» փուլը պետք է ապահովի հաստատված փուլով ընդունված լուծումները և աշխատանքների իրականացման հաջորդականությունը _____

հղման են նախատեսված, եղանակ, շինման առաջին աշխատանքները և այլ աշխատանքներ

6. *Հրաջեղում է N 1 հաշվեկազմի 13-րդ կետով նախատեսված դեպքերում*

«հաշվի առնելով, որ կառուցվող օբյեկտի շինարարությունը հնարավոր չէ առանց զլխավոր հաստակածի վրա

_____ համարների տակ նշված շենքի /շենքերի/ և /կամ/

շինության /շինությունների/ _____

քանդման

հղման են տնտեսությանը կամ մասնա շենքի մեջ կա օբյեկտներ, որոնց կմնացած շենքերից, ընդունար մակերևույթ, հարկանքներ, շինարարից և այլն

աշխատանքներից /աշխատությունների/ _____

տրված սույն թույլտվությունը

մաս քանդման թույլտվություն է:

հղման է ստանալն զրանման վերջին համարը

Օբյեկտի քանդման աշխատանքներն իրականացնել նախագծային փաստաթղթերով ամրագրված ուղղորդականությամբ:

7. Այլ պայմաններ _____

հղման են իրականացնող և դրան պահանջողով նախատեսված այլ պայմաններ

8. Կառուցապատողը շինարարական /շենքի մաս, ապամոնտաժման/ աշխատանքներն սկսելուց առնվազն 3 օր առաջ N 5 հաշվեկազմի M 2-5 մեկ տեղեկացնում է իրավասու մարմինը:

9. Թույլտվության հիման վրա լցանկացած շինարարական և զուգահեռ աշխատանք կարող է իրականացվել Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, նախագծային փաստաթղթերին և նորմատիվ-տեխնիկական պահանջներին համապատասխան:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՏԱՌՈՒԹՅԱՆ ԻԶԵՎԱՆ

ՀԱՄԱՅՆՔ

ՂԵՎԱԿԱՆ

ԱՌԹՈՒՐ ՃԱՌԱՌՑԱՆ

Կնիք, աղանդներ



Հավելված 7՝ «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի գրություն

«ՀԱՅԱՆՏԱՐ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊՐԵՑԵԴԵՆՏԻ ՎԵՐԱԿԱՆԱԾՈՒԹՅԱՆ ԴԻՐԵԿՏՈՐ	«ՀԱՅԱՆՏԱՐ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊՐԵՑԵԴԵՆՏԻ ՎԵՐԱԿԱՆԱԾՈՒԹՅԱՆ ԴԻՐԵԿՏՈՐ	«HAYANTAR» STATESMAN ASSOCIATION ORGANIZATION Director
---	---	--

Իրավա՝ 0047, Ա. Կրմեանյան 129
Տեղ. 03.06.2024 ՝ Կ. Թ. Գ. Գ. Գ.

ՀՀ տարածքային զարգացման
ինքնադրամի գործադիր տնօրեն
Ա. Սողոմոնյանին

Հարգելի պարոն Սողոմոնյան

Ի պատասխան Ձեր դիմումի՝ «Գնեստիմ» ընկերության խնդրի առաջին
ջրագրի և աղբյուրակապի կառուցում՝ ծրագրի իրականացման վերաբերյալ ինքնուրույն
եմ, որ «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ը դեմ չէ վերոհիշյալ ծրագրի իրականացմանը:

Հարգանքով
պաշտոնակատար

Սևակ Մարկոսյան
