

Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագիր

Բաղադրիչ 2

Վերջնական բնապահպանական և սոցիալական գնահատման թերթիկ

Միկրոծրագրի անվանումը՝ Սարապատ համայնքի Հոդմիկ, Գեղիովիտ և Թորոսգյուղ բնակավայրերում ինքնահոս ոռոգման համակարգի կառուցում և վերանորոգում

Միկրոծրագրի համարը՝ W- 29

Մշակվել է արդյոք Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլան՝

Այո + Ոչ _____

ԲՄԿՊ-ում նկարագրված են արդյոք՞ հնարավոր բոլոր ազեցությունները և դրանք մեղմացնելու համապատասխան միջոցառումները:

Այո + Ոչ _____

Վերջնական բնապահպանական և սոցիալական գնահատման եզրակացությունը

Եզրակացություն	
Միկրոծրագիրը մերժվել է	Ենթածրագիրը հաստատվել է (բնապահպանական և սոցիալական գնահատումը ավարտվել է)
	+

ԲԱԺԻՆ Ա : ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԾՐԱԳԻՐ ԵՎ ՏԵՂԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ	
Երկիր	Հայաստանի Հանրապետություն
Ծրագրի անվանումը	Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման
Ծրագրի աշխատանքների նկարագիր	W – 29, Սարապատ համայնքի Հոդմիկ, Գեղհովիտ և Թորոսցյուղ բնակավայրերում ինքնահոս ոռոգման համակարգի կառուցում և վերանորոգում
Ինստիտուցիոնալ համաձայնագրեր (ՀԲ)	Սարապատ համայնք, Շիրակի մարզ
Իրականացման համաձայնագրեր (ՀՀ)	Ծրագրով նախատեսվում է Սարապատ համայնքի երեք բնակավայրերի տարածքներում ոռոգման համակարգի կառուցման և վերակառուցման աշխատանքների իրականացում: Հոդմիկ բնակավայրում նախատեսվում է գոյություն ունեցող ջրանցքի 0,12կմ սեղանաձև հատվածի վերակառուցում: Մասնակի վերանորոգվում է գոյություն ունեցող դյուկերը: Ապամոնտաժվում են քայքայված ե/բետոնե ՄՊ-6 և ՄՊ-4 տիպի վաքերը և մոնտաժվում մոտ 1,14կմ ընդհանուր երկարությամբ նոր ՄՊ-6 և ՄՊ-4 վաքերով: Հոդե հունների փոխարեն կառուցվում է շուրջ 2.55կմ երկարությամբ պոլիէթիլենե d=160մմ տրամագծով խողովակներից ոռոգման ցանց: Բոլոր անհրաժեշտ տեղերում, շահառուների և շահագործող կազմակերպության հետ համաձայնեցված, նախատեսված են ջրաչափական հանգույցվեր, ջրթողներ և խողովակ անցումներ: Ջրաչափերի և ջրթողների հատվածներում խողովակները պողպատյա են (dy=150մմ և dy=200մմ): Վերակառուցվող ցանցը նախատեսված է Հոդմիկ բնակավայրի 132հա հողատարածքների ոռոգման համար: Գոգհովիտ բնակավայրում «Աջափնյա» ջրանցքի Բ-1 բաժանարարից կառուցվում է թվով վեց ջրագիծ 2.68 կմ ընդհանուր երկարությամբ, պոլիէթիլենե d=160մմ տրամագծով խողովակներից: Բոլոր անհրաժեշտ տեղերում, շահառուների և շահագործող կազմակերպության հետ համաձայնեցված, նախատեսված են ջրաչափական հանգույցներ և ջրթողներ: Ջրաչափերի և ջրթողների հատվածներում խողովակները պողպատյա են (dy=150մմ և dy=200մմ): Վերակառուցվող ցանցը նախատեսված է Գոգհովիտ բնակավայրի 107հա հողատարածքների ոռոգման համար: Թորոսցյուղ բնակավայրում նախատեսվում է 0.65 կմ ընդհանուր երկարությամբ, պոլիէթիլենե d=160մմ տրամագծով խողովակներից ոռոգման ցանցի վերակառուցում: Բոլոր անհրաժեշտ տեղերում, շահառուների և շահագործող կազմակերպության հետ համաձայնեցված, նախատեսված են ջրաչափական հանգույցներ և ջրթողներ: Ջրաչափերի և ջրթողների հատվածներում խողովակները պողպատյա են (dy=150մմ և dy=200մմ): Նախատեսված են գոյություն ունեցող ջրաչափակերի և ջրթողներ վերանորոգում: Վերակառուցվող ցանցը նախատեսված է Թորոսցյուղ բնակավայրի 60հա հողատարածքների ոռոգման համար:

Ծրագրի անվանումը	Ծրագրի ղեկավար Իվան Դրաբեկ	Երաշխիքների մասնագետ՝ Դարեջան Կապանաձե (բնապահպանական) Վեռա Դուգանձից (սոցիալական)	
Ծրագրի աշխատանքների նկարագիր	Իրականացնող կազմակերպություն՝ ՀՏԶՀ Ասյա Օսիպովա (բնապահպանական) Քնարիկ Գրիգորյան (սոցիալական)	Տեխնիկական վերահսկիչ Ալտերնատիվ ՍՊԸ	Կապալառու Մե դ ի ս ո ն Է յ Բ Լ ՍՊԸ
ՏԵՂԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ			
Վերականգնվող տարածքի սեփականատեր կազմակերպության անվանումը	Շիրակի մարզի ջրային վարչություն, Խնածախի խմելու ջրամատակարարում ՊՈԱԿ		
Վերանորոգվող/կառուցվող կառույցի հասցեն և գտնվելու վայրը	Շիրակի մարզ		
Հողի սեփականատերը Ո՞վ է օգտագործում այդ հողը (ֆորմալ/ոչ ֆորմալ)	Թորոսգյուղ և Գեղհովիտ համայնքներում խողովակաշարը կկառուցվի համայնքային հողերի վրա՝ մասնավոր հողակտորների միջև ընկած հատվածում՝ առանց հատելու մասնավոր հողեր: Միայն Հողմիկ համայնքում է, որ խողովակաշարը հատելու է ինը մասնավոր հողակտորներ՝ այդ հողատարածքներին ոռոգման ջուր հասցնելու համար: Հողամասերի սեփականատերերը գրավոր համաձայնություն են տվել, որ ստորգետնյա խողովակաշարը անցնի իրենց հողերով, և սեփականատերերի հետ կնքվել է համատեղ օգտագործման պայմանագիր (սերվիտուտ): Շինարարական աշխատանքները իրականացնելիս նախատեսվում է հաշվի առնել հողի սերմնաբուծության, մշակման և բերքահավաքի ժամանակաշրջանները:		
Տվյալ ծրագրի վայրի շրջապատող ֆիզիկական և բնական միջավայրի նկարագրությունը	Ոռոգման խողովակաշարը կկառուցվի Թորոսգյուղ, Գեղհովիտ և Հողմիկ համայնքներում: Շինարարական ռելիեֆը լեռնային է և ժայռոտ: Առաջարկվող աշխատանքների տարածքում առկա է սակավ բուսականություն, հիմնականում փոքր թփեր: Շինարարական աշխատանքները կիրականացվեն		

	գյուղերից և Գյումրի-Բավրա մայրուղուց հեռու: Հողմիկ համայնքում ստորգետնյա խողովակաշարը ինը վայրերում հատելու է հանրային հողակտորները՝ այդ հողատարածքներին ոռոգման ջուր հասցնելու համար: Այս հողերը հիմնականում օգտագործվում են հացահատիկի մշակման համար: Շինարարական աշխատանքները նախատեսվում է հաշվի առնել հողի սերմնաբուծության, մշակման և բերքահավաքի ժամանակաշրջանները: Կվերականգնվի ոռոգման համակարգը, որը կապահովի ոռոգում 299 հա հողատարածքների համար, այդ թվում՝ 132 հա Հոգմիկում, 107 հա Գոգովիտում և 60 հա Թորոսգյուխում: Ենթաճրագրի շահառուների թիվը 3650 է, ուղիղ օգտագործողների թիվը՝ 1204:
--	---

ՕՐԵՆՄԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ազգային և տեղական օրենսդրություն և թույլտվություններ, որոնք պահանջվում են ծրագրում	ՀՀ հետևյալ օրենքները սահմանում են իրավական շրջանակը, որը կիրառելի է ծրագրի գործունեության համար. - Մթնոլորտային օդի պաշտպանության մասին ՀՀ օրենքի (1994) «Մթնոլորտային օդի պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի նպատակը ՀՀ կառավարության հիմնական սկզբունքների սահմանումն է՝ ուղղված մթնոլորտային օդի մաքրության ապահովմանը և օդի որակի բարելավմանը, օդի որակի վրա քիմիական, ֆիզիկական, կենսաբանական և այլ ազդեցությունների կանխարգելմանը և մեղմմանը: Սույն օրենքը նաև կարգավորում է արտանետումների լիցենզիաները և ապահովում է մթնոլորտային օդի աղտոտման առավելագույն թույլատրելի բեռներ / կոնցենտրացիաներ և այլն: Համաձայն այս օրենքի, կապալառուն պարտավոր է իրականացնել շինարարական աշխատանքներ, ինչպես նաև աղբի տեղափոխում և ժամանակավոր պահպանում փոշին և
--	---

	այլ արտանետումները նվազագույնի հասցնելու նպատակով: Թափոնների մասին ՀՀ օրենք (2004) Օրենքը իրավական և տնտեսական հիմք է տալիս թափոնների հավաքման, տեղափոխման, հեռացման, մաքրման, վերաօգտագործման, ինչպես նաև թափոնների բացասական ազդեցության կանխարգելման համար՝ բնական պաշարների, մարդու կյանքի և առողջության վրա: Օրենքը սահմանում է պետական լիազոր մարմինների, ինչպես նաև թափոնների արտադրող կազմակերպությունների դերն ու պարտականությունները թափոնների կառավարման գործընթացներում: Համաձայն այս օրենքի, շինարարական գործունեությունից առաջացած թափոնները պետք է վերամշակվեն ըստ անհրաժեշտության կամ տեղահանվեն նշանակված վայրերում: Ընտրված վայրերում շինարարական թափոնների և ավելցուկային նյութերի հեռացումը պետք է գրավոր հաստատվի համայնքապետարանի կողմից: Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին ՀՀ օրենք (2014) Օրենքը սահմանում է գործունեության տեսակը, որը ենթակա է շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և շրջակա միջավայրի փորձաքննության: Ըստ սույն օրենքի, վերականգնման առաջարկվող աշխատանքները ենթակա չեն շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության պետական փորձաքննության: - «ՀՀ քաղաքաշինության մասին» օրենք (1998) Համաձայն ՀՀ օրենսդրության ծրագրի իրականացման համար
--	---

	պահանջվում են հետևյալ թույլտվությունները՝ ➤ Շինարարական թույլտվություն ➤ Շինարարական աղբի թափոնակույտման վայրի թույլտվություն ➤ Ջրօգտագործման թույլտվություն
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ	
Ե՞րբ և ո՞րտեղ տեղի կունենա հանրային քննարկումը	Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանը կներկայացվի հանրային քննարկման ընթացքում Zoom առցանց հարթակի կիջոցով Ապրիլի 6-ին: Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանը կտեղադրվի ՀՏԶՀ-ի պաշտոնական կայքում (atdf.am) և համայնքի տեսանելի վայրերում՝ հայտարարությունների տախտակների վրա: Պլանավորված աշխատանքների վերաբերյալ տեղեկատվությունը կներկայացվի շինարարական հրապարակի մոտակայքում և համայնքապետարանի տեղեկատվական տախտակների վրա:
ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ	
Հավելված 1. Քարտեզ և լուսանկարները Հավելված 2. Թափոնների հեռացման թույլտվության պատճեն Հավելված 3. Ջրօգտագործման թույլտվություն Հավելված 4. Մասնավոր հողերի սեփականատերերի հետ իրականացված հանդիպման արձանագրություն Հավելված 5. Բնապահպանական և սոցիալական հանրային լսումների արձանագրություն Հավելված 6. Շինարարության իրականացման թույլտվություն	

ՄԱՍ Բ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Շրջակա միջավայրի/սոցիալական ցուցանիշներ			
	Գործունեություն/հիմնահարց	Կարգավիճակ	Խթանային գործողություններ
Արդյոք աշխատանքները կներառի/կընդգրկի նշվածներից որեւէ մեկը	Ա. Ջրագծի վերականգնում	[+] Այո [] Ոչ	Տես ստորեւ Բաժին Ա-ն
	Բ. Նոր շինարարություն	[+] Այո [] Ոչ	Տես ստորեւ Բաժին Ա-ն
	Գ. Կեղտաջրերի հեռացման առանձին համակարգ	[] Այո [+] Ոչ	Տես ստորեւ Բաժին Բ-ն
	Դ. Պատմական շենքեր եւ շրջաններ	[] Այո [+] Ոչ	Տես ստորեւ Բաժին

	Գ-ն		
	Ե. Հողի ձեռքբերում	[] Այո [+] Ոչ	Տես ստորեւ Բաժին Դ-ն
	Զ. Վտանգավոր կամ թունավոր նյութեր	[] Այո [+] Ոչ	Տես ստորեւ Բաժին Ե-ն
	Է. Ազդեցությունը անտառների եւ/կամ պաշտպանված տարածքների վրա	[] Այո [+] Ոչ	Տես ստորեւ Բաժին Զ-ն
	Ը. Բժշկական թափոնների կարգավորում/կառավարում	[] Այո [+] Ոչ	Տես ստորեւ Բաժին Է-ն
	Թ. Երթեւեկության եւ հետիոտնային անվտանգություն	[+] Այո [] Ոչ	Տես ստորեւ Բաժին Ը-ն

ՄԱՍ Գ: ՄԵՂՄԱՅՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱԴՈՒՄՆԵՐ

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՑՈՒՑԱՆԻՇ	ՄԵՂՄԱՅՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱԴՈՒՄՆԵՐ
Օ. Ընդհանուր պայմաններ	Ծանուցում եւ աշխատողների անվտանգություն	➤ Շինարարական եւ շրջակա միջավայրի տեղական տեսչություններին տեղեկացվել է առաջիկա աշխատանքների մասին: ➤ Հանրությանը համապատասխանաբար տեղեկացվել է աշխատանքների վերաբերյալ (այդ թվում⁸ տեղանքի աշխատանքների վերաբերյալ): ➤ Ձեռք են բերվել իրավաբանական բոլոր թույլտվությունները շինարարության եւ/կամ վերականգնման համար ➤ Կապալառուն պաշտոնապես համաձայն է, որ ողջ աշխատանքն իրականացվի ապահով եւ սահմանված կարգով, նվազեցնելով ազդեցությունները հարեւան բնակավայրերի եւ միջավայրի վրա: ➤ Աշխատակիցները պետք է համապատասխանեն միջազգային լավ փարձին (մշտապես սաղավարտներով, անհրաժեշտ դիմակներով եւ անվտանգ ակնոցներով, ամրագոտիներով եւ ապահով երկարաճիտ կոշիկներով): ➤ Տեղանքների համապատասխան ցուցասյուները պետք է տեղեկացնեն աշխատողներին հետեւել հիմնական կանոններին:
Ա. Ընդհանուր շինարարական պայմաններ	Օդի որակ	➤ Շինարարական աղբը պետք է պահվի վերահսկվող գոտում եւ ցողվի ջրով⁹ շինարարական փոշին նվազեցնելու համար: ➤ Շրջակա միջավայրը (մայթեր, ճանապարհներ) պետք է ազատվեն շինարարական աղբից⁹ փոշին նվազեցնելու համար: ➤ Տեղանքում բաց վիճակում չպետք է այրել շինարարական թափոններ: ➤ Տեղանքներում չպետք է լինի չափից դուրս շատ չօդազործվող շինարարական

	Աղմուկ	փոխադրամիջոցներ: ➤ Շինարարության աղմուկը պետք է սահմանափակվի թույլատրելի սահմաններում: ➤ Աշխատանքների ընթացքում գեներատորների շարժիչները, օդային կոմպրեսորները եւ մյուս մեխանիկական սարքավորումները պետք է փակվեն, իսկ սարքավորումը պետք է տեղադրվի բնակելի վայրերից հնարավորինս հեռու:
	Զրի որակ	➤ Տեղանքում պետք է սահմանվեն էոզդիայի եւ նստվածքի վերահսկման միջոցառումներ, ինչպես օրինակ՝ հնձած խոտի հակեր և/կամ տիդմային ցանկապատեր, որոնք կանխում են հեռացնել նստվածքը տեղանքից եւ մեծ խտության պատճառ են հանդիսանում մոտակա վտակներում եւ գետերում:
	Թափոնների կառավարում	➤ Թափոնների հավաքման եւ հեռացման ու տեղանքները պետք է հատկացվեն բոլոր տեսակի թափոնների համար, որոնք ակնկալվում են շենքերի քանդման եւ շինարարական աշխատանքներից: ➤ Շենքերի քանդման թափոնները պետք է առանձնացվեն եւ տեսակավորվեն համապատասխան կոնտեյներներում: ➤ Շինարարական թափոնը պետք է հավաքվի եւ համապատասխանաբար հեռացվի հավաքողների կողմից: ➤ Թափոնների հեռացման մասին տվյալները պետք է որպես ապացույց պահպանվեն համապատասխանաբար մշակված կառավարման համակարգում:
Բ. Սոցիալական պայմաններ	Հասարակայնության հետ կապերի կառավարում	Շինարարն ունի տեղական հետադարձ կապն ապահովող անձնավորություն ով նշանակված է ապահովելու տեղական բնակչության հետ հաղորդակցությունը և առաջարկություններ/բողոքներ ստանալը ա. Տեղական բնակչության հետ իրականացվել են խորհրդակցություններ նույնականացնելու և ակտիվ ձևով կառավարելու տեղական բնակչության և դրսից բերված աշխատուժի միջև ծագող հնարավոր կոնֆլիկտները

		բ. Կապալառուն բարձրացնում է տեղական բնակչության իրազեկվածությունը սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդությունների ռիսկերի վերաբերյալ, որոնք կարող են կապված լինել դրսից բերված աշխատուժի հետ գ. Բնակչությունը համապատասխան դեպքերում իրազեկված է շինարարական աշխատանքների ժամանակացույցի վերաբերյալ, ծառայությունների կասեցման, երթևեկության տարանցիկ ուղիների և ավտոբուսների ժամանակավոր կանգառների, պայթեցման և քանդման աշխատանքների, դ. Շինարարական աշխատանքները չեն իրականացվում գիշերային ժամերին: Անհրաժեշտության դեպքում գիշերային աշխատանքների համար կկազմվեն պատշաճ ժամանակացույցեր և համայնքները պատշաճ կերպով կտեղեկացվեն այդ մասին, այնպես որ հնարավոր կլինի ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցառումներ: Ցանկացած ծառայության դադարեցումից նվազագույնը հինգ օր առաջ (ներառյալ ջուր, էլեկտրոէներգիա, հեռախոս, ավտոբուսային երթուղիներ), համայնքի անդամները իրազեկվում են նախօրոք ծրագրի վայրում, ավտոբուսային կազառներում և ազդակիր տներում հայտարարությունների միջոցով:
	Աշխատուժի կառավարում	ա. Աշխատանքային ճամբարները կտեղակայվեն տեղական համայնքներից հեռու, այնքանով որքանով դա հնարավոր է: բ. Աշխատանքային ճամբարների տեղակայումը և գործառնությունը կիրականացվի հարևան համայնքների հետ խորհրդակցությունների արդյունքում գ. Կապալառուն կվարձի այնքանչորակավորված և կիսաորակավորված աշխատողներ տեղական համայնքներից, որքան հնարավոր է: Տեղական բնակչության ներգրավումը բարձրացնելու նպատակով կիրականացվեն թրեյնինգներ այնտեղ որտեղ այն տեղին է և երբ անհրաժեշտ է: դ. Համապատասխան սանիտարական հարմարությունների (զուգարաններ և լվացարան) առկայություն շինարարության

		վայրում՝ ներառյալ տաք և սառը հոսող ջրի, օճառների և ձեռքերը չորացնելու հարմարություններ: Ե. Կապալառուն բարձրացնում է աշխատողների իրազեկվածությունը տեղական բնակչության հետ հարաբերությունների կառավարման, վարքագծի կանոնների վերաբերյալ համաձայն միջազգային գործելակերպին և խստորեն հետևում է դրանց, ներառյալ աշխատողներին աշխատանքից հեռացնելը և համապատասխան ֆինանսական տույժերի նշանակումը:
--	--	---

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ ՊԼԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՓՈԻԼԵՐՈՒՄ

Գործունեություն	Ինչ (պարամետր է վերահսկվելու)	Որտեղ (է պարամե տրը վերահսկ վելու)	Ինչպես (է պարամե տրը վերահսկ վելու)	Երբ (սահման ել հաճախա կանությո ւնը/կամ շարունա կականու թյունը)	Ինչու (է պարամե տրը վերահսկվ ելու)	Ով (է պատաս խանատ ու պարամե տրի վերահսկ ման համար)
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈԻԼ						
1. Շինարարական նյութերի մատակարարում	Շինարարական նյութերի գնումը արտոնագրված մատակարարներից	Մատակարարների գրասենյակներ և պահեստներ փոխառության վայրերի	Փաստաթղթերի ստուգում Նյութերի որակի ստուգում	Նյութերի մատակարարման վերաբերյալ համաձայնագրերի ստորագրման ընթացքում	Ապահովել շինարարության տեխնիկական որակը Պաշտպանել մարդկանց առողջությունը և միջավայրը	ՀՏԶՀ Տեխնիկական վերահսկողություն
2.Շինարարական նյութերի և թափոնների տեղափոխում Շինարարական սարքավորումների տեղաշարժ	Շինարարական տեխնիկայի և մեքենաների տեխնիկական վիճակը Բեռնատար մեքենաների և բեռի համապատասխանություն, բաց մեքենաներով տեղափոխվող բեռի ծածկում Շինարարական տրանսպորտային միջոցների և մեքենաների տեղափոխում սահմանված երթուղիներով	Շինարարական նյութերի և շինարարական թափոնների փոխադրման համար երթուղիներ	Շինարարական վայրի հարակից ճանապարհներում դիտագնումներ առյալ նախապես համաձայնեցված տեղափոխության երթուղիները	Չնախատեսված ստուգումներ աշխատանքային ժամերին	Խուսափել փոշուց և կոշտ թափոններից օդի և ճանապարհների աղտոտվածությունից Նվազեցնել ճանապարհային խոչընդոտները	ՀՏԶՀ, Ճանապարհային ոստիկանություն Տեղ համայնք


3.Շինարարական թափոնների կուտակում	Ֆորմալ ձևավորված աղբավայրերի ժամանակին մաքրում	Շինարարության վայր և հիմք (եթե կիրառելի է) Աղբի տեղափոխության համար ձևավորված աղբավայրեր	Ստուգաթերթեր Դիտագնում	Ընթացքում և աշխատանքային ժամերի	Խուսափել շրջակա միջավայրի աղտոտումից	ՀՏՁՀ,
4.Կենցաղային աղբի առաջացում	Աղբարկղերի ապահովում, թափոնների տեղադրումը տեղում: Թափոնների կանոնավոր տեղափոխության շուրջ տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ համաձայնություն	Շինարարական հրապարակ	Դիտագնում	Շինարարության ամբողջ ժամանակահատվածում	Խուսափել կենցաղային աղբի պատճառով հողի եւ ջրի աղտոտվածությունից,	ՀՏՁՀ
5.Աշխատանքի անվտանգություն	Աշխատողներին հատուկ համազգեստի և պաշտպանական միջոցների տրամադրումը և դրանց կիրառման պարտադրում կառուցապատողին Շինարարական սարքավորումների օգտագործման և շահագործման կանոնների անվտանգության պահպանման միջոցառումների հետևում	Շինարարական հրապարակ	Գործունեության ստուգում	Շինարարության ամբողջ ժամանակահատվածում	Նվազեցնել պատահարների հավանականությունները	ՀՏՁՀ Տեխնիկական վերահսկող
6. Պատահական գտածոներ	- Աշխատանքների դադարեցում՝ անմիջապես փոփոխության գտածոների բախումից հետո. - Պաշտոնական հաղորդակցություն ՀՀ հուշարձանների և պատմական վայրերի պաշտպանության գործակալության հետ՝ պատահական գտածոների հետ. - Անհրաժեշտ պեղումների և տեղանքների պահպանման ուղղությամբ ձեռնարկված	Շինհրապարակ	- Պատահական գտածոների գնում. - Ներկայացված փաստաթղթերի ստուգում	Շինարարության ամբողջ ընթացքում	Համոզվել, որ մշակութային հուշարձանը չի վնասվել շինարարական աշխատանքների ընթացքում	ՀՏՁՀ Տեխնիկական վերահսկող

	Ժամանակին պայմանավորվածություններ					
7. Շինհրապարակների վերամշակումը և կանաչապատումը	Անհրաժեշտության դեպքում, շինհրապարակի և մշտական մուտքի ճանապարհների և տարածքի կանաչապատում և ավարտական մաքրում	Շինհրապարակ և մուտքի ճանապարհներ	Զննում և փորձաքննություն	Շինարարության վերջնական փուլում	Նվազագույնի հասցնել լանդշաֆտի գեղագիտական արժեքի կորուստը շինարարական գործունեության արդյունքում	ՀՏՁՀ Տեխնիկական վերահսկող
8. Կենցաղային թափոնների կառավարում	Աղբամանների տեղադրում և աղբի պարբերաբար հեռացում նախատեսված աղբավայր	Վերակառուցված ճանապարհ	Վերականգնված ճանապարհի գնում	Շահագործման փուլ	Աղբի կուտակումների և կեղտաջրերի կառավարում	ՀՏՁՀ Տեխնիկական վերահսկող
9. Գործունեություն մասնավոր սեփականության և այլ գույքի կողքին	Խուսափել մասնավոր գույքի սահմանների խախտումներից կամ պատահականորեն վնասելու դեպքերից (պատերի և ցանկապատերի հարևանությամբ կիրառել փոքր չափերի մեքենաներ կամ ձեռքով աշխատանք, շինարարական նյութերի պահեստավորումը և թափոնների հավաքումը կազմակերպել մասնավոր սեփականությունից հեռու և այլն)։ Մասնավոր սեփականությանը ոչ դիտավորյալ վնասի հասցման դեպքում արագ վերականգնել նախնական վիճակը կամ ավելի լավ կարգավիճակը։ Մասնավոր սեփականության վրա ակնկալվող ժամանակավոր ազդեցության դեպքում սեփականատերերին նախապես տեղեկացնել և երաշխավորել գույքի վերականգնումը, ձեռքբերել սեփականատերերի գրավոր համաձայնությունը միջամտության համար և անհապաղ վերականգնել վնասը։ Եթե աշխատանքների ընթացքում մասնավոր հողի օգտագործման կարիք է առաջանում, մի մտեք	Մասնավոր սեփականության հարևանությամբ իրականացվող աշխատանքներ	Զննում և փորձաքննություն	Շինարարության ամբողջ ընթացքում	Նվազեցնել մասնավոր սեփականությանը վնասի հասցման հավանականությունը։ Բացառել մասնավոր սեփականության վրա սեփականատիրոջ կամ օգտագործողի իրավունքների ժամանակավոր կամ մշտական խախտումը։	ՀՏՁՀ Տեխնիկական վերահսկող

	ազդակիր տարածք մինչև տարաբնակեցման ծրագրի ամբողջական մշակումն ու իրականացումը:					
10.Փոշու կուտակում	Օդի աղտոտման մակարդակը շինհրապարակում	Շինհրապարակ և մուտքի ճանապարհներ	Տեսողական զննում	Կրկնվող	Նվազեցնել ռիսկերը աշխատակազմի և հարևան համայնքների համար	ՀՏՁՀ Տեխնիկական վերահսկող
11.Բողոքների լուծման մեխանիզմի գործածում	Ենթածրագրի վերաբերյալ բողոքների կամ հարցերի վերաբերյալ հանրային իրավունք: Դիմում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարին (համայնքային իշխանություններին): Բողոքների համակարգողի նշանակում (բողոքների ստացում, վերանայում և բացատրություն, բողոքների գրանցքում մատյանում և փորձ լուծել դրանք ոտքի վրա): Բողոքատուն կարող է դիմել անմիջապես ՀՏՁՀ՝ թեժ գիծ ծառայության (010 24 01 59), փոստային նամակի (Երևան 0037, Կ. Ուլնեցի 31), էլեկտրոնային նամակի (support@atdf.am). կամ ՀՏՁՀ-ի կայքում տեղադրված գործիքի միջոցով (http://atdf.am/hy/Home/ContactUs):	Շին հրապարակ	Փորձաքննություն	Շինարարության ամբողջ ընթացքում	Բողոքի քննարկում և լուծում 2 շաբաթվա ընթացքում: Խնդրի լուծման ձախողման դեպքում նախարարության կամ իրականացնող կազմակերպության մակարդակում, ԾԱԵԱ-ն կարող է դիմել դատարանին որոշման կայացման համար՝ ՀՀ օրենսդրության համաձայն	ՀՏՁՀ Տեխնիկական վերահսկող
12. Պատրաստվածությունը COVID-19-ին շինարարական հրապարակում	- Աշխատատեղում ձեռքի վազման միջոցների ապահովում՝ հոսող ջրի, ձեռքի օձառի, ձեռքի ալկոհոլային հիմքով մաքրող միջոցների և ձեռքի չորացման սարքերով բավարար պաշարներով - Աշխատավայրի մուտքի կարգի սահմանում և բժշկական ստուգումները	Շինարարական հրապարակ	Գործողությունների վերհսկում	Աշխատանքների ամբողջ ընթացքում	Նվազեցնել COVID-19 համավարակի ռիսկերը շինարարական հրապարակում	ՀՏՁՀ Տեխնիկական վերահսկող

	- Ընդհանուր օգտագործման սենյակների, զուգարանների, սարքավորումների, գործիքների և թափոնների կանոնավոր ախտահանում; - Աշխատանքային պրակտիկա` աշխատողների միջև շփումը նվազեցնելու կամ նվազագույնի հասցնելու համար</li> <li>- Դիմակների և այլ համապատասխան անվտանգության միջոցների տրամադրում ծրագրի բոլոր աշխատողներին` շինարարական հրապարակի մուտքի մոտ:					
ՇԱՀՍԳՈՐԾՄԱՆ ՓՈԻԼ						
1.Ջրամատակարարման սահուն շահագործման ապահովում	Ջրամատակարարման խողովակաշարի մշտական սպասարկում	Ջրամատակարարման ցանց	Վիզուալ մշտադիտարկում	Ամբողջ օրվա ընթացքում	Ջրաօգտագործողների որակյալ սպասարկման ապահովում	Մարապատի համայնքապետարան
2. Ոռոգման ջրի որակի ապահովում	Ոռոգման ջրի ստանդարտներին համապատասխանություն	Ջրամատակարարման սխեմա	Գործիքային մեթոդներ	Ամբողջ օրվա ընթացքում	Ջրածին հիվանդությունների առաջացման կանխում	ՀՀ հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն
3. Ոռոգման ջրամատակարարման ռեժիմի հստակության ապահովում:	Ոռոգման ջրի մատակարարման որոշակի ռեժիմի ժամանակացույցի համապատասխանություն	Ջրամատակարարման սխեմա	Վիզուալ մշտադիտարկում	Ամբողջ օրվա ընթացքում	Խուսափել ջրամատակարարման ընդահատումներից	Մարապատի համայնքապետարան

Հավելված 1` Նկարներ և տեղանքի քարտեզ

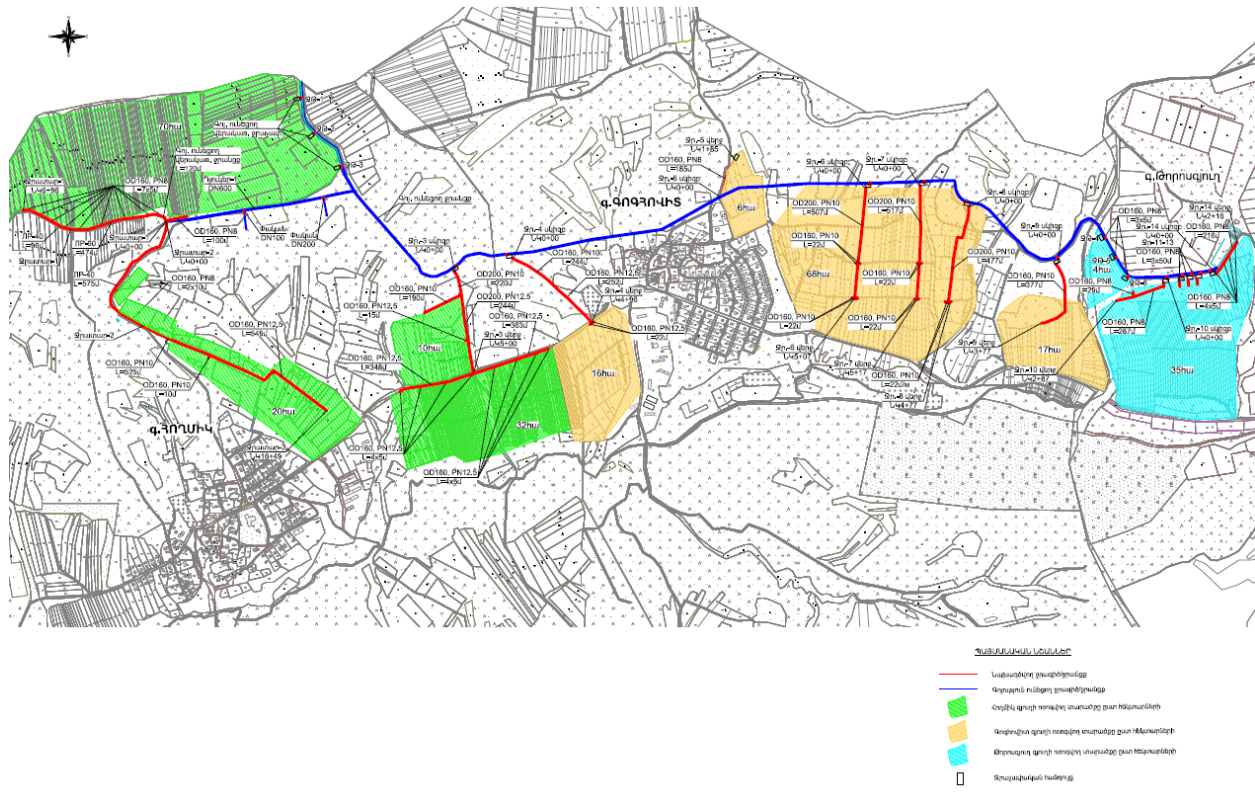



Հավելված 2՝ Թափոնների հեռացման համաձայնության պատճեն

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ
ՍԱՐԱՊԱՏՈՒ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ**

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն
Հայրենիքի մասին հրահրություն
ՀՀ Շիրակի մարզի մարզպետի հրահրություն
ՀՀ Շիրակի մարզի մարզպետի հրահրություն
N 58
19 փետրվար 2021 թ.

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ
ՍԱՐԱՊԱՏՈՒ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ**

Հարգելի պարոն Սողոմոնյան

Տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ ՀՀ Շիրակի մարզի Սարապատ համայնքի կողմից Հայաստանի Տարածքային Ջրագնացման Հիմնադրամին ներկայացված <<Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Սարապատ համայնքում ընդգրկված Հովիթի, Գոգիովիտ և Բորոսգյուլ բնակավայրերի ոռոգման ինքնաշխատ համակարգի կառուցում և վերանորոգում>> ծրագրի իրականացման ժամկետով առաջարկված շինարարական աշխատանքների ֆինանսավորման գումարի օգտագործումը / Իրավասությունը 2.3 կմ:

**ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱԿԱՐ
(ՀԱՄԱՆՈՒԿՅԱՆ)**

Հավելված 3՝ Ջրօգտագործման համաձայնություն



«ՀԻՐԱԿ» ԶԻՐԱՅԱՆՈՐՈՂՈՒՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՈՒՅՈՒՄՈՒՆ
 ՀԱՅԿԱՆ ԶԻՐԱՅԱՆՈՐՈՂՈՒՆԵՐ «ՈՒԲԲԱԿ»
 "HIBAK" WATER USERS' ASSOCIATION

Հեռ. 093 900 412
 Էլ. 093 900 412
 Գր. 093 900 412
 ԲՈՒՄ 093 900 412

Հիմնական տվյալներ
 Թիվ 138
 21 փետրվարի 2020թ.

ՀՀ Շիրակի մարզի Մարապատ
 Համայնքի ղեկավար
 Պարոն Ա. Մանուկյանին

Հարգելի պարոն Մանուկյան

Ի պատասխան Ձեր 2020թ. փետրվարի 7-ի թիվ 48 գրության հարուստ եմ, որ «Հիբակ» ԶՕՀ-ն ՀՀ Շիրակի մարզի Մարապատ համայնքում բնակվող Հայրիկ, Գոհավառ և Թորոպետ ընկերությունների ուղղման իրենց համայնքի կառուցման և վերանորոգման, խոշորացման համայնքի համար սկզբնական և ավարտական կայանի ստեղծման» ծրագրով կառուցման ենթակա ուղղման համայնքի ստեղծմանը աջակցում է կատարել «Արաբիկա» ջրանցքի Բ-1 բաժանարարից սկսվող ջրանցքի վերանորոգումը:

«Արաբիկա» ջրանցքի Բ-1 բաժանարարից սկսվող ջրանցքի շահագործումը սկսվել է 1978թ.-ից: Գլխամասային թողունային լիանվեր, երկարությունը 9180 մետր, որից 70%-ը բնակելի, մնացածը ստորգետնյա խողովակներ են:

«Հիբակ» ԶՕՀ-ի գործադիր տնօրեն Մ. Գրիգորյան

Մասնագետ Ա. Մկրտչյան
 093 900 412

Հավելված 4՝ Մասնավոր հողերի սեփականատարերի հետ իրականացված քննարկման արձանագրություն



~ 15 ~ Հայրիկ, 2020 թ. փետրվարի 21-ի
 Մարզիկների ընկերությունների ղեկավարներին
 Կարգավորվող

1. Բնակիչ Գրիգորյան մասնագետ Վահագնյան ը

2. Բնակիչ Վահագնյան ը

3. Բնակիչ Վահագնյան ը

4. Բնակիչ Վահագնյան ը

5. Բնակիչ Վահագնյան ը

6. Բնակիչ Վահագնյան ը

7. Բնակիչ Վահագնյան ը

1. Բնակիչ Վահագնյան մասնագետ Վահագնյան ը

2. Բնակիչ Վահագնյան մասնագետ Վահագնյան ը

3. Բնակիչ Վահագնյան մասնագետ Վահագնյան ը

1

Ա. Օսիպովան նշեց համայնքի անդամների և աշխատակիցների անվտանգության ապահովման միջոցառումների և շինարարության պատճառով կյանքի խաթարման ռիսկեր մասին: Օսիպովան նաև նշեց կանխատեսվող բացասական բնապահպանական ազդեցությունների մասին՝ աղբի կուտակման, օդի աղտոտման, աղմուկի և վիբրացիայի, որոնք կարող են առաջանալ շինարարական աշխատանքների իրականացման ընթացքում: Ինչպես նաև ներկայացվեցին ՀՏԶՀ-ի կողմից իրականացվող միջոցառումների մասին՝ ուղղված այս ազդեցությունների մեղմացմանը: Նշեց որ, ամսական կտրվածքով

իրականացվելու է տեխնիկական վերահսկողություն և կկատարվեն ԲՄԿՊ-ում ներառված բոլոր բնապահպանական մեղմացնող միջոցառումները: Նաև նշվեց, որ ԲՄԿՊ-ում ներառված են աղբահանության գործընթացին ներկայացվող պահանջները:

Ներկայացվեցին շինարարական հրապարակում Covid-19 համավարակի տարածմքն կանխարգելման միջոցառումները, որոնց իրականացումը շինարարական հրապարակում պարտադիր է:


Քնարիկ Գրիգորյանը նշեց, որ ենթածրագրի իրականացման համար սպասվում է հողօգտագործում: Նա նշեց, որ ազդեցության ենթակա հողերի սեփականատերերի հետ կնքվել են համատեղ օգտագործման (սերվիտուտի) պայմանագրեր, ինչպես նաև գրավոր համաձայնություն է վերցվել բոլոր հողատերերից, որոնց հողատարածքը կօգտագործվի շինարարական աշխատանքների ընթացքում: Հողօգտագործման և պայմանագրերի պատճառներն ու էությունը ևս մեկ անգամ ներկայացվեցին:

Ք. Գրիգորյանը ներկայացրեց բողոքների լուծման մեխանիզմը, կոնտակտային տվյալները և բողոքների լուծման տեղական համակարգողին՝ Համլետ Ավանեսյանին:

Ք. Գրիգորյանը և Ա. Օսիպովան խնդրեցին մասնակիցներին բարձրաձայնել իրենց հարցերը:

Հարց հնչեցվեց, թե ապագայում հնարավոր է արդյոք կառուցել նոր ջրթող խողովակ՝ դեպի մասնավոր հող տանող: Նախագծող ընկերության ներկայացուցիչը պատասխանեց, որ, իհարկե, ապագայում հնարավոր է կառուցել նոր խողովակաշար, բայց այդ հարցը պետք է նախապես համաձայնեցվի ջրօգտագործման կազմակերպության հետ, որը կիրականացնի շահագործումը կառուցման համակարգի պահպանում:

Նկարներ

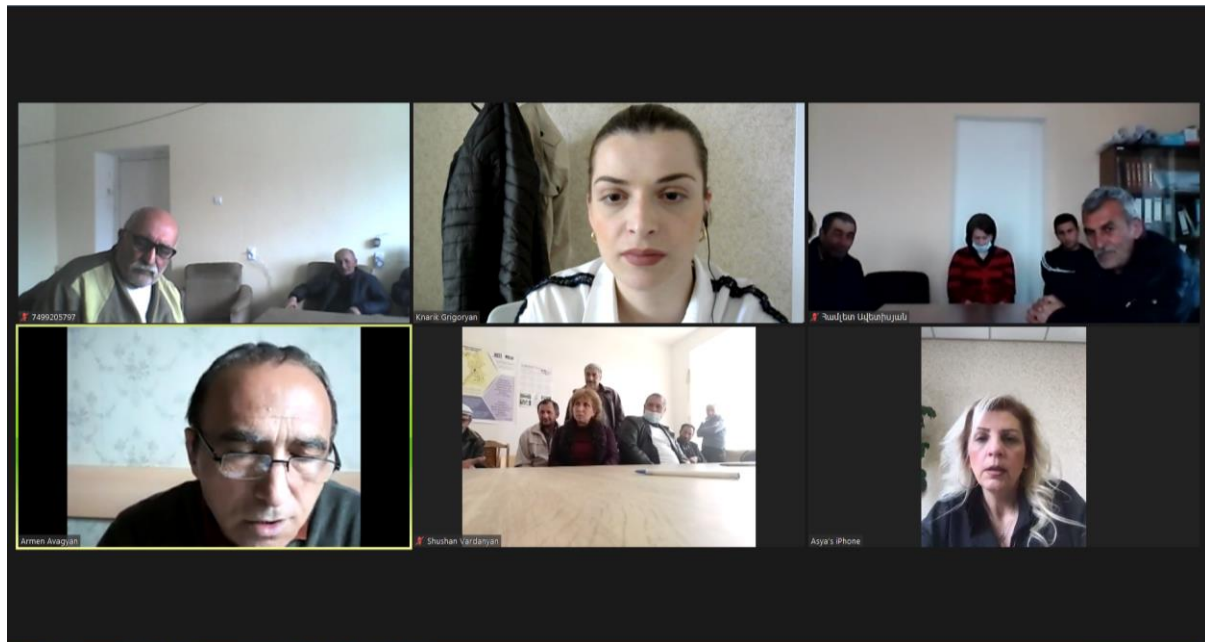

Մասնակիցների ցանկ

Անուն/ազգանուն
Կյուրեղյան Աշոտ
Վարդանյան Շուշան
Աբեղյան Սևակ
Հարությունյան Սևակ
Գասպարյան Վարազդատ
Աղաբեկյան Ավետիք
Պողոսյան Հրայր
Աբգարյան Էդգար
Զաքարյան Մանվել
Հակոբյան Սարգիս
Հակոբյան Մհեր
Կիրակոսյան Ալբերտ
Ավետիսյան Սերգեյ
Ավետիսյան Ալբերտ
Մինասյան Մարտունիկ
Մանուկյան Սլավիկ
Սուքիասյան Գևորգ
Տիգրանյան Գագիկ

Հարությունյան Վարուժան
Շահբազյան Արմեն
Սարգսյան Արմենակ
Մաթևոսյան Նառա
Սարգսյան Միլաիդա
Հարությունյան Լյովա
Հովհաննիսյան Անդրանիկ
Հովհաննիսյան Էդգար
Հարությունյան Գրիգոր
Ադաբաբյան Արա
Հակոբյան Հայկ
Տիգրանյան Գևորգ
Պետրոսյան Անդրանիկ
Ավանեսյան Համլետ
Ավագյան Արմեն
Օսիպովա Ասյա
Գրիգորյան Քնարիկ

Հավելված 6՝ Ծինարարության իրականացման թույլտվություն



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ, ԱՄԱՍԻԱ

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

N 4 27 ապրիլ 2023թ

Տրված է
կառուցապատող

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ, Երևան,
Ուլենեցու 31

(իրավաբանական անձի անվանումը, պետական գրանցման վկայականի համարը)

ՀՀ Շիրակի մարզ Ամասիա համայնք բնակավայր Հողմիկ _____ հասցեում

(ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը, հասցեն, հողամասի գտնվելու վայրը)

ՀՀ Շիրակի մարզի Ամասիա համայնք Հողմիկ բնակավայրի ոռոգման
համակարգի կառուցում և վերանորոգում _____ օբյեկտի

(օբյեկտի անվանումը, զինամյուսթյան աստիճանը (կատեգորիան), հանկրծ քննազնի, հիմնական ցուցանիշները)

Կառուցում և վերանորոգում _____ շինարարական աշխատանքների կատարման, այդ
թվում՝ _____

(նոր կառուցման, վերակառուցման, վերակառուցման, ուղղացման
և այլն)

կառուցապատվող հողամասի գլխավոր հատակագծի
վրա նշված ոչ հիմնական կառույցների _____ տեղադրման
համար:

(նշվում են ոչ հիմնական
կառույցների անվանումները)

1. Օբյեկտի նախագծային
փաստաթղթերը՝
1) մշակվել են

«Ջրվոր» ՍՊԸ

(նախագծային փաստաթղթերի փուլը, նախագծային աշխատանքների կատարողի
անվանումը)

N 10/պփ-14 _____ կողմից,

(ըզեմբլայի համարը)

2) ստացել է (են) 18/02/2021 թ. N10/պփ-14 փորձագիտական դրական եզրակացությունը
(եզրակացությունները)

(նշել փորձագիտության տեսակը)

«ՀՀ ՆՊԱՓ» ՓԲԸ

կողմից

(նշել փորձագիտության մարմնի (մարմինների) անվանումը, ժողովի համարը)

կամ նախագիծը թողարկող պատասխանատու
կապալառուի երաշխավորագիրը՝

17074

(նշել նախագիծը թողարկող պատասխանատու կապալառուի
երաշխավորության պայմանագրի համարը)

3) սահմանված կարգով համաձայնեցվել են իրավասու
մարմնի, օրենքով սահմանված այլ շահագրգիռ մարմինների _____ թ. N _____ հետ:

(նշել մարմինների անվանումները և
համաձայնեցման ժամկետները)

2. Շինարարական աշխատանքներն
իրականացնել

Երկու տարի ընթացքում:
(նշել շինարարության երկամսթվային
տևողությունը)

ներառյալ ավարտական ակտի տրամադրման համար ավարտված շինարարական օբյեկտն
ընդունող հանձնաժողովի աշխատանքի համար նախատեսվող ժամկետը:

2.1. Ապահովել օբյեկտի շահագործման թույլտվության ստացումը՝

[] ավարտական ակտի տրամադրումից մեկ ամսվա ընթացքում,

[] ավարտական ակտի տրամադրման օրը:

3. Շինարարության վարման մատյանը բաղկացած է էջից, կարված և դրոշմակնքված է
կողմից:

4. Նախագծային փաստաթղթերը փոփոխվել են

(լրացվում է N 1 հավելվածի 108-րդ կետով նախատեսված դեպքերում)

կողմից

(նախագծային աշխատանքների կապալառուի անվանումը, փոփոխադրողի համարը)

և սահմանված կարգով համաձայնեցվել իրավասու մարմնի

և այլ
(նշել իրավասու մարմնի անվանումը)

շահագրգիռ մարմինների

հետ:
(նշել զբեմնով սահմանված համաձայնեցվող մարմինների անվանումները)

5. Հատուկ պայմաններ՝

1) Կառուցապատողը նախքան շինարարությունն սկսելը, ինչպես նաև դրա ընթացքում,
պարտավոր է հասցվելիք վնասների փոխհատուցման համար համաձայնության գալ
կառուցապատման հետևանքով վնասներ կրող սուբյեկտների հետ:

2) Շինարարության թույլտվությամբ սահմանված ժամկետներում կառուցապատումը
չավարտելու դեպքում գործում են N 1 հավելվածի 123-126-րդ կետերով սահմանված
պահանջները:

3) (լրացվում է N 1 հավելվածի 84-րդ կետով սահմանված դեպքերում) սույն թույլտվությունը
տրվել է սահմանված կարգով հաստատված «Նախագիծ» փուլի հիման վրա, որին հաջորդող
«Աշխատանքային փաստաթղթեր» փուլը պետք է ապահովի հաստատված փուլով ընդունված
լուծումները և աշխատանքների իրականացման հաջորդականությունը

(նշել են նախապատրաստման, հորսքին, շինմնառաջին աշխատանքները և այլ աշխատանքներ)

6. (լրացվում է N1 հավելվածի 13-րդ կետով սահմանված դեպքերում)

Հաշվի առնելով, որ կառուցվող օբյեկտի շինարարությունը հնարավոր չէ առանց գլխավոր
հատակագծի վրա համարների տակ նշված շենքի (շենքերի) և կամ շինության

(շինությունների) քանդման՝

(նշելով են ակտիվությամբ կամ մասամբ քանդման երեւակա օբյեկտները, դրանց իմասական
ցուցանիշները, ընդհանուր մակերեսը, հարկայնությունը, շինանյութերը և այլն)

սեփականատիրոջը (օգտագործողին)

(նշելով է պետական գրանցման վկայականի համարը)

տրված սույն թույլտվությունը նաև քանդման թույլտվություն է:

Օբյեկտի քանդման աշխատանքներն իրականացնել նախագծային փաստաթղթերով
ամրագրված հաջորդականությամբ:

7. Այլ պայմաններ

