

Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագիր

Բաղադրիչ 1

**Վերջնական բնապահպանական և սոցիալական գնահատման
թերթիկ**

Միկրոծրագրի անվանումը՝ Նոր Ավան թաղամասի կոյուղու ցանցի և բիոմաքրման կայանի կառուցում

Միկրոծրագրի համարը՝ AFT-VZ-02

Մշակվել է արդյոք Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլան՝

Այո + Ոչ _____

ԲՍԿՊ-ում նկարագրված են արդյո՞ք հնարավոր բոլոր ազեցությունները և դրանք մեղմացնելու համապատասխան միջոցառումները:

Այո + Ոչ _____

Վերջնական բնապահպանական և սոցիալական գնահատման եզրակացությունը

Եզրակացություն	
Միկրոծրագիրը մերժվել է	Ենթածրագիրը հաստատվել է (բնապահպանական և սոցիալական գնահատումը ավարտվել է)
	+

ԲԱԺԻՆ Ա : ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԾՐԱԳԻՐ ԵՎ ՏԵՂԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ			
Երկիր	Հայաստանի Հանրապետություն		
Ծրագրի անվանումը	Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման		
Ծրագրի աշխատանքների նկարագիր	AFT-VZ-02, Նոր Ավան թաղամասի կոյուղու ցանցի և բիոմաքրման կայանի կառուցում		
Ինստիտուցիոնալ համաձայնագրեր (ՀԲ)	Եղեգնաձոր համայնք, Վայոց Ձորի մարզ		
Իրականացման համաձայնագրեր (ՀՀ)	Միկրոճրագրով նախատեսվում են հետևյալ շինարարական աշխատանքները. Հիմնական կոյուղու կոլեկտորի և դրան միացված տասնվեց կոյուղագծերի կառուցում, ինչպես նաև կենսամաքրման կայանի տեղադրում: Կոյուղու համակարգը, որի ընդհանուր երկարությունը 6245 մ է, նախատեսվում է պատրաստել պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակներից d=150 մմ, d=200 մմ և d=250 մմ: Կոյուղու հիմնական կոլեկտորի երկարությունը 1726 մ է, իսկ կոլեկտորին միացող կոյուղագծերի/ճյուղերի ընդհանուր երկարությունը՝ 3879 մ: Համակարգում նախատեսվում է տեղադրել 191 դիտահոր: Գլխավոր կոլեկտորը հատում է Երևան-Մեղրի մայրուղին, իսկ կոյուղագծերը/ճյուղերը հատում են առուներն ու ձորերը: Այս մասերի հատման համար նախատեսված են մետաղական պաշտպանիչ պատյաններ և անցումային կամուրջներ: Հիմնական կոյուղու կոլեկտորի վերջում նախատեսվում է կառուցել երկու մոդուլից բաղկացած կենսամաքրման կայան, որի արտադրողականությունը կազմում է 180 խմ/օր (90 խմ/օր x 2 մոդուլ): Երկու մոդուլից բաղկացած կենսամաքրման կայանը նախատեսված է մինչև 1000 մարդ բնակչություն ունեցող թաղամասի կամ բնակավայրի համար: Թաղամասի բնակչության թիվը 701 է: Կենսամաքրման կայանից դուրս եկող մաքրված ջուրը մոտ 640 մ երկարությամբ խողովակաշարով կլցվի Արփա գետ: Կեղտաջրերի բացթողման թույլտվությունը, որը թույլ կտա Եղեգնաձորի կենսաբանական մաքրման կայանին մաքրված ջուրը բաց թողնել բնական ջրամբար, կտրվի Շրջակա միջավայրի նախարարության կողմից՝ Եղեգնաձորի համայնքային վարչական գրասենյակի կողմից ներկայացված հայտի փաթեթի հիման վրա և կլցվի ԲՍԿԴ-ին:		
Ծրագրի անվանումը	Ծրագրի ղեկավար Իվան Դրաբեկ	Երաշխիքների մասնագետ՝ Դարեջան Կապանաձե (բնապահպանական) Դեվիդ Զիջելավա (սոցիալական)	
Ծրագրի աշխատանքների նկարագիր	Իրականացնող կազմակերպություն՝ ՀՏՀՀ Ասյա Օսիպովա (բնապահպանական)	Տեխնիկական վերահսկիչ Իրտիգ ՍՊԸ	Կապալառու Արտեգիա ՍՊԸ

	Քնարիկ Գրիգորյան (սոցիալական)		
ՏԵՂԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ			
Վերականգնվող տարածքի սեփականատեր կազմակերպության անվանումը	«Վեոյա ջուր» ՓԲԸ		
Վերանորոգվող/կառուցվող կառույցի հասցեն և գտնվելու վայրը	Եղեգնաձոր համայնք, Վայոց Ձորի մարզ		
Հողի սեփականատերը Ո՞վ է օգտագործում այդ հողը (ֆորմալ/ոչ ֆորմալ)	Միկրոծրագրի շրջանակներում առաջարկվող հողատարածքները պատկանում են Եղեգնաձոր համայնքին: Խողովակաշարերը կկառուցվեն գործող ճանապարհների երկայնքով: Կենսաբանական մաքրման կայանի տեղադրման համար առաջարկվող հողամասը (864 մ2 մակերեսով) համայնքի սեփականությունն է: Միկրոծրագրի շրջանակներում շինարարության համար առաջարկվող հողատարածքները պաշտոնապես կամ ոչ պաշտոնապես չեն օգտագործվում մասնավոր նպատակներով: Օգտագործվող հողերի վրա մասնավոր շինություններ կամ այլ գույք չկան: Խողովակաշարը չի անցնի մասնավոր հողատարածքներով (տես Հավելված 3):		
Տվյալ ծրագրի վայրի շրջապատող ֆիզիկական և բնական միջավայրի նկարագրությունը	Եղեգնաձոր համայնքի Նոր Ավան թաղամասը չունի կենտրոնացված կոյուղու համակարգ, և ներկայումս վերոնշյալ թաղամասի բնակիչներն օգտվում են կենցաղային ջրհորներից: Միկրոծրագրով նախատեսվում է կառուցել կոյուղու ցանց և տեղադրել բիոմաքրման կայան: Կոյուղու նոր ցանցը կկառուցվի Արփա գետի աջ ափով՝ Երևանից մոտ 120 կմ հարավ-արևելք: Կլիման մերձարևադարձային է, չոր: Այստեղ ամառը չոր է, իսկ ձմռանը՝ ցուրտ: Օդի միջին ջերմաստիճանը հունվարին -5-6°C է, նվազագույնը՝ -22°C, հուլիսինը՝ +35°C: Տարեկան միջին տեղումները 300-400 մմ են, իսկ ջրի մի մասը թափանցում է օգտակար հանածոների և հողի միջով: Երկրաբանական տեսակետից ուսումնասիրվող տարածքը բնութագրվում է ավազախճային բաղադրությամբ: Աշխատանքի համար երկրաբանական պայմանները բարենպաստ են՝ տարածքում չեն նկատվում սողանքներ, սելավներ, աղակալած հողեր: Շինարարական աշխատանքների ժամանակ ծառերի հեռացում չի սպասվում: Տեղում չեն աճում էնդեմիկ տեսակներ և բույսեր: Կենդանական աշխարհը սակավ է՝ գայլ, աղվես, սկյուռ, նապաստակ հազվադեպ են հանդիպում: Կան տարածքներ, որտեղ շինարարական աշխատանքներ կիրականացվեն երթևեկելի մասի մոտ, սպասվում է տեղական երթևեկության		

	խափանում: Համաձայն ազգային օրենսդրության՝ Կապալառուից կպահանջվի ապահովել շինհրապարակի համապատասխան անվտանգությունը և շինարարության հետ կապված երթևեկության վերահսկողությունը: Նշանները, նախազգուշական նշանները, արգելապատնեշները և շրջանցիկ երթուղիները կլինեն տեղում, և հանրությանը կզգուշացվի բոլոր հնարավոր վտանգների մասին: Շինարարական աշխատանքներից հետո աշխատանքային տարածքները կվերականգնվեն բնական ռելիեֆին համապատասխան:
ՕՐԵՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ	
Ազգային և տեղական օրենսդրություն և թույլտվություններ, որոնք պահանջվում են ծրագրում	ՀՀ հետևյալ օրենքները սահմանում են իրավական շրջանակը, որը կիրառելի է ծրագրի գործունեության համար. - Մթնոլորտային օդի պաշտպանության մասին ՀՀ օրենքի (1994) «Մթնոլորտային օդի պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի նպատակը ՀՀ կառավարության հիմնական սկզբունքների սահմանումն է՝ ուղղված մթնոլորտային օդի մաքրության ապահովմանը և օդի որակի բարելավմանը, օդի որակի վրա քիմիական, ֆիզիկական, կենսաբանական և այլ ազդեցությունների կանխարգելմանը և մեղմմանը: Սույն օրենքը նաև կարգավորում է արտանետումների լիցենզիաները և ապահովում է մթնոլորտային օդի աղտոտման առավելագույն թույլատրելի բեռներ / կոնցենտրացիաներ և այլն: Համաձայն այս օրենքի, կապալառուն պարտավոր է իրականացնել շինարարական աշխատանքներ, ինչպես նաև աղբի տեղափոխում և ժամանակավոր պահպանում փոշին և այլ արտանետումները նվազագույնի հասցնելու նպատակով: Թափոնների մասին ՀՀ օրենք (2004) Օրենքը իրավական և տնտեսական հիմք է տալիս թափոնների հավաքման, տեղափոխման, հեռացման, մաքրման, վերաօգտագործման, ինչպես նաև թափոնների բացասական ազդեցության կանխարգելման համար՝ բնական պաշարների, մարդու կյանքի և առողջության վրա: Օրենքը սահմանում է պետական

	լիազոր մարմինների, ինչպես նաև թափոնների արտադրող կազմակերպությունների դերն ու պարտականությունները թափոնների կառավարման գործընթացներում: Համաձայն այս օրենքի, շինարարական գործունեությունից առաջացած թափոնները պետք է վերամշակվեն ըստ անհրաժեշտության կամ տեղահանվեն նշանակված վայրերում: Ընտրված վայրերում շինարարական թափոնների և ավելցուկային նյութերի հեռացումը պետք է գրավոր հաստատվի համայնքապետարանի կողմից: Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին ՀՀ օրենք (2014) Օրենքը սահմանում է գործունեության տեսակը, որը ենթակա է շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և շրջակա միջավայրի փորձաքննության: Ըստ սույն օրենքի, վերականգնման առաջարկվող աշխատանքները ենթակա չեն շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության պետական փորձաքննության: - «ՀՀ քաղաքաշինության մասին» օրենք (1998) Համաձայն ՀՀ օրենսդրության ծրագրի իրականացման համար պահանջվում են հետևյալ թույլտվությունները՝ ➤ Շինարարական թույլտվություն ➤ Շինարարական աղբի թափոնակույտման վայրի թույլտվություն ➤ Զրոգտագործման թույլտվություն
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ	
Ե՞րբ և ո՞րտեղ տեղի կունենա հանրային քննարկումը	Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանը ներկայացվել է տեղական բնակչությանը Հանրային քննարկման ընթացքում 2022 թվականի Դեկտեմբերի 22-ին՝ Եղեգնաձորի համայնքապետարանում: Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանի սևագիր տարբերակը տեղադրվել է ՀՏՀ-ի պաշտոնական կայքում (atdf.am) և համայնքի կայքում (www.yeghegnadzor.am): Պլանավորված աշխատանքների վերաբերյալ տեղեկատվությունը կներկայացվի շինարարական հրապարակի մոտակայքում և համայնքապետարանի տեղեկատվական տախտակների վրա:
ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ	

Հավելված 1. Լուսանկարներ և քարտեզներ

Հավելված 2. Թափոնների հեռացման թույլտվության պատճեն

Հավելված 3. Համայնքի ղեկավարի գրությունը հողերի կարգավիճակի վերաբերյալ

Հավելված 4. Շրջակա միջավայրի նախարարության կեղտաջրերի բացթողման
թույլտվության պատճենը

Հավելված 5. ԲՍԿԴ-ի վերաբերյալ հանրային քննարկման արձանագրություն

Հավելված 6. Շինարարության իրականացման թույլտվություն

ՄԱՍ Բ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Շրջակա միջավայրի/սոցիալական ցուցանիշներ			
Արդյոք աշխատանքները կներառի/ կընդգրկի նշվածներից որեւէ մեկը	Գործունեություն/հիմնահարց	Կարգավիճակ	Խթանային գործողություններ
	1. Կեղտաջրերի համակարգի կառուցում/վերակառուցում	[+] Այո [] Ոչ	Տես ստորեւ Բաժին Ա-ն
	2. Նոր շինարարություն	[+] Այո [] Ոչ	Տես ստորեւ Բաժին Ա-ն
	3. Կեղտաջրերի հեռացման առանձին համակարգ	[+] Այո [] Ոչ	Տես ստորեւ Բաժին Բ-ն
	4. Պատմական շենքեր եւ շրջաններ	[] Այո [+] Ոչ	Տես ստորեւ Բաժին Գ-ն
	5. Հողի ձեռքբերում	[] Այո [+] Ոչ	Տես ստորեւ Բաժին Դ-ն
	6. Վտանգավոր կամ թունավոր նյութեր	[] Այո [+] Ոչ	Տես ստորեւ Բաժին Ե-ն
	7. Ազդեցությունը անտառների եւ/կամ պաշտպանված տարածքների վրա	[] Այո [+] Ոչ	Տես ստորեւ Բաժին Ձ-ն
	8. Բժշկական թափոնների կարգավորում/կառավարում	[] Այո [+] Ոչ	Տես ստորեւ Բաժին Է-ն
	9. Երթևեկություն և հետիոտների անվտանգություն	[+] Այո [] Ոչ	Տես ստորեւ Բաժին Ժ-ն
	Թ. Սոցիալական ռիսկ	[+] Այո [] Ոչ	Տես ստորեւ Բաժին Ը-ն

ՄԱՍ Գ: ՄԵՂՄԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՑՈՒՑԱՆԻՇ	ՄԵՂՄԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ
Օ.Ընդհանուր պայմաններ	Ծանուցում եւ աշխատողների անվտանգություն	➤ Շինարարական եւ շրջակա միջավայրի տեղական տեսչություններին տեղեկացվել է առաջիկա աշխատանքների մասին: ➤ Հանրությանը համապատասխանաբար տեղեկացվել է աշխատանքների վերաբերյալ (այդ թվում^ա տեղանքի աշխատանքների վերաբերյալ): ➤ Ձեռք են բերվել իրավաբանական բոլոր թույլտվությունները շինարարության եւ/կամ վերականգնման համար ➤ Կապալառուն պաշտոնապես համաձայն է, որ ողջ աշխատանքն իրականացվի ապահով եւ սահմանված կարգով, նվազեցնելով ազդեցությունները հարեան բնակավայրերի եւ միջավայրի վրա: ➤ Աշխատակիցները պետք է համապատասխանեն միջազգային լավ փարձին (մշտապես սաղավարտներով, անհրաժեշտ դիմակներով եւ անվտանգ ակնոցներով, ամրագոտիներով եւ ապահով երկարաճիտ կոշիկներով): ➤ Տեղանքների համապատասխան ցուցասյուները պետք է տեղեկացնեն աշխատողներին հետեւել հիմնական կանոններին:
Ա. Ընդհանուր շիրարարական պայմաններ	Օդի որակ	➤ Շինարարական աղբը պետք է պահվի վերահսկվող գոտում եւ ցողվի ջրով^ա շինարարական փոշին նվազեցնելու համար: ➤ Շրջակա միջավայրը (մայթեր, ճանապարհներ) պետք է ազատվեն շինարարական աղբից^ա փոշին նվազեցնելու համար: ➤ Տեղանքում բաց վիճակում չպետք է այրել շինարարական թափոններ: ➤ Տեղանքներում չպետք է լինի չափից դուրս շատ չօգտագործվող շինարարական փոխադրամիջոցներ:
	Աղմուկ	➤ Շինարարության աղմուկը պետք է սահմանափակվի թույլատրելի սահմաններում: ➤ Աշխատանքների ընթացքում գեներատորների շարժիչները, օդային կոմպրեսորները եւ մյուս մեխանիկական սարքավորումները պետք է փակվեն, իսկ սարքավորումը պետք է տեղադրվի բնակելի վայրերից հնարավորինս հեռու:
	Ջրի որակ	➤ Տեղանքում պետք է սահմանվեն էռոզիայի եւ նստվածքի վերահսկման միջոցառումներ, ինչպես օրինակ^ա հնձած խոտի հակեր և/կամ տիղմային ցանկապատեր, որոնք կանխում են հեռացնել նստվածքը տեղանքից եւ մեծ խտության պատճառ են

	Թափոնների կառավարում	հանդիսանում մոտակա վտակներում եւ գետերում: ➤ Թափոնների հավաքման եւ հեռացման ու տեղանքները պետք է հատկացվեն բոլոր տեսակի թափոնների համար, որոնք ակնկալվում են շենքերի քանդման եւ շինարարական աշխատանքներից: ➤ Շենքերի քանդման թափոնները պետք է առանձնացվեն եւ տեսակավորվեն համապատասխան կոնտեյներներում: ➤ Շինարարական թափոնը պետք է հավաքվի եւ համապատասխանաբար հեռացվի հավաքողների կողմից: ➤ Թափոնների հեռացման մասին տվյալները պետք է որպես ապացույց պահպանվեն համապատասխանաբար մշակված կառավարման համակարգում:
Բ. Կեղտաջրերի մաքրման անհատական համակարգ	Ջրի որակը	ա) Շինհրապարակներից սանիտարական թափոնների և կեղտաջրերի հետ աշխատելու մոտեցումը (տեղադրում կամ վերակառուցում) հաստատված է տեղական իշխանությունների կողմից: (բ) Կեղտաջրերի առանձին համակարգերից կեղտաջրերը մաքրվում են ընդունող ջրեր թափվելուց առաջ, որպեսզի համապատասխանեն արտահոսքի որակի և կեղտաջրերի մաքրման ազգային ուղեցույցներով սահմանված որակի նվազագույն չափանիշներին: (գ) Կատարվում է կեղտաջրերի նոր համակարգերի մոնիտորինգ (նախքան/հետո): (դ) Շինարարական մեքենաները և մեքենաները լվացվում են միայն հատուկ նշանակված տարածքներում, որտեղ արտահոսքը չի աղտոտում բնական մակերևութային ջրային մարմինները:
Թ. Սոցիալական ռիսկեր	Հասարակայնության հետ կապերի կառավարում	Շինարարն ունի տեղական հետադարձ կապն ապահովող անձնավորություն ով նշանակված է ապահովելու տեղական բնակչության հետ հաղորդակցությունը և առաջարկություններ/բողոքներ ստանալը ա. Տեղական բնակչության հետ իրականացվել են խորհրդակցություններ նույնականացնելու և ակտիվ ձևով կառավարելու տեղական բնակչության և դրսից բերված աշխատուժի միջև ծագող հնարավոր կոնֆլիկտները բ. Կապալառուն բարձրացնում է տեղական բնակչության իրազեկվածությունը սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդությունների ռիսկերի վերաբերյալ , որոնք կարող են կապված լինել դրսից բերված աշխատուժի հետ գ. Բնակչությունը համապատասխան դեպքերում իրազեկված է շինարարական աշխատանքների ժամանակացույցի վերաբերյալ, ծառայությունների կասեցման, երթևեկության տարանցիկ ուղիների և ավտոբուսների ժամանակավոր կանգառների, պայթեցման և քանդման աշխատանքների,

		դ. Շինարարական աշխատանքները չեն իրականացվում գիշերային ժամերին: Անհրաժեշտության դեպքում գիշերային աշխատանքների համար կկազմվեն պատշաճ ժամանակացույցեր և համայնքները պատշաճ կերպով կտեղեկացվեն այդ մասին, այնպես որ հնարավոր կլինի ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցառումներ: Ցանկացած ծառայության դադարեցումից նվազագույնը հինգ օր առաջ (ներառյալ ջուր, էլեկտրոէներգիա, հեռախոս, ավտոբուսային երթուղիներ), համայնքի անդամները իրազեկվում են նախօրոք ծրագրի վայրում, ավտոբուսային կազառներում և ազդակի տներում հայտարարությունների միջոցով:
	Աշխատուժի կառավարում	ա. Աշխատանքային ճամբարները կտեղակայվեն տեղական համայնքներից հեռու, այնքանով որքանով դա հնարավոր է: բ. Աշխատանքային ճամբարների տեղակայումը և գործառնությունը կիրականացվի հարևան համայնքների հետ խորհրդակցությունների արդյունքում գ. Կապալառուն կվարձի այնքանչորակավորված և կիսաորակավորված աշխատողներ տեղական համայնքներից, որքան հնարավոր է: Տեղական բնակչության ներգրավումը բարձրացնելու նպատակով կիրականացվեն թրեյնինգներ այնտեղ որտեղ այն տեղին է և երբ անհրաժեշտ է: դ. Համապատասխան սանիտարական հարմարությունների (զուգարաններ և լվացարան) առկայություն շինարարության վայրում՝ ներառյալ տաք և սառը հոսող ջրի, օճառների և ձեռքերը չորացնելու հարմարություններ: ե. Կապալառուն բարձրացնում է աշխատողների իրազեկվածությունը տեղական բնակչության հետ հարաբերությունների կառավարման, վարքագծի կանոնների վերաբերյալ համաձայն միջազգային գործելակերպին և խստորեն հետևում է դրանց, ներառյալ աշխատողներին աշխատանքից հեռացնելը և համապատասխան ֆինանսական տույժերի նշանակումը:
	Բողոքների Լուծման Մեխանիզմի (ԲԼՄ) կառավարում	(ա) ԲԼՄ-ն ստեղծվել և գովազդվում է տեղական մակարդակում: Կապալառուն տեղեկացվում է ստացված բանավոր և ոչ բանավոր բողոքները գրանցելու և ԾԻԳ-ին հայտնելու իր պատասխանատվության մասին: (բ) ԲԼՄ կոնտակտային տվյալները, ներառյալ տեղական կենտրոնական կետերը, տեղադրվել են շինհրապարակում և տեղական համայնքի վարչական գրասենյակում: (գ) ԲԼՄ տեղական համակարգողը ստանում և գրանցում է բնակչության բողոքները ԲԼՄ մատյանում և պարբերաբար հաղորդում է բողոքները ԾԻԳ-ին:

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ ՊԼԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՓՈԽԼԵՐՈՒՄ

Գործունեություն	Ինչ (պարամետր է վերահսկվելու)	Որտեղ (է պարամետր ը վերահսկվել ու)	Ինչպես (է պարամետր ը վերահսկվել ու)	Երբ (սահմանել հաճախականությունը /կամ շարունակականությունը)	Ինչու (է պարամետր ը վերահսկվել ու)	Ով (է պատասխան ատու պարամետրի վերահսկման համար)
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽԼ						
1. Շինարարական նյութերի մատակարարում	Շինարարական նյութերի գնումը արտոնագրված մատակարարներից	Մատակարարների գրասենյակներ և պահեստներ փոխառության վայրերի	Փաստաթղթերի ստուգում Նյութերի որակի ստուգում	Նյութերի մատակարարման վերաբերյալ համաձայնագրերի ստորագրման ընթացքում	Ապահովել շինարարության տեխնիկական որակը Պաշտպանել մարդկանց առողջությունը և միջավայրը	ՀՏՀՀ Տեխնիկական վերահսկողության կազմակերպություն
2. Շինարարական նյութերի և թափոնների տեղափոխում Շինարարական սարքավորումների տեղաշարժ	Շինարարական տեխնիկայի և մեքենաների տեխնիկական վիճակը Բեռնատար մեքենաների և բեռի համապատասխանություն, բաց մեքենաներով տեղափոխվող բեռի ծածկում Շինարարական տրանսպորտային	Շինարարական նյութերի և շինարարական թափոնների փոխադրման համար երթուղիներ	Շինարարական վայրին հարակից ճանապարհներում դիտազննում ներառյալ նախապես համաձայնեցված տեղափոխության երթուղիները	Չնախատեսված ստուգումներ աշխատանքային ժամերին	Խուսափել փոշուց և կոշտ թափոններից օդի և ճանապարհների աղտոտվածությունից Նվազեցնել ճանապարհային խոչընդոտները	ՀՏՀՀ, Ճանապարհային ոստիկանություն Տեխնիկական վերահսկողության կազմակերպություն

	միջոցների և մեքենաների տեղափոխում սահմանված երթուղիներով					
3. Շինարարական սարքավորումների պահպանություն	- մեքենաների և շինտեխնիկայի լվացում շինհրապարակից դուրս կամ բնական հոսքերից առավելագույն հեռավորության վրա. - շինհրապարակից դուրս կամ նախապես որոշված սահմանափակված տարածքում շինարարական սարքավորումների վառելիք լցոնում կամ յուղում:	Շինարարական հրապարակ	Իրականացման հսկողություն	Պատահական այցելությունների աշխատանքային ժամերին	- խուսափել սարքավորումների շահագործման պատճառով ջրի և հողի աղտոտումից նավթամթերքներից. - հրդեհի դեպքում ժամանակին տեղայնացնել և նվազեցնել սպասվող վնասը:	<S2< Տեխնիկական վերահսկողության կազմակերպություն

4. Շինարարական թափոնների կուտակում	- Շինարարական աղբի ժամանակավոր պեհաստավորում հատուկ հատկացված տարածքներում - Իներտ և վտանգավոր թափոնների ժամանակավոր պահեստավորում նշանակված վայրերում - Աղբի՝ ժամանակին տեղափոխում Ֆորմալ ձևավորված աղբավայրեր	Շինարարության վայր և հիմք (եթե կիրառելի է) Աղբի տեղափոխության և համար ձևավորված աղբավայրեր	Ստուգաթերթեր Դիտագննում	Ընթացքում և աշխատանքային ժամերի	Խուսափել շրջակա միջավայրի աղտոտումից	ՀՏՀՀ, Տեխնիկական վերահսկողության կազմակերպություն
5. Կենցաղային աղբի առաջացում	-Աղբարկղերի ապահովում, -Թափոնների կանոնավոր տեղափոխության շուրջ տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ համաձայնություն	Շինարարական հրապարակ	Դիտագննում	Շինարարության ամբողջ ժամանակահատվածում	Խուսափել կենցաղային աղբի պատճառով հողի եւ ջրի աղտոտվածությունից,	ՀՏՀՀ
6. Աշխատանքի անվտանգություն	-Աշխատողներին հատուկ համազգեստի և պաշտպանական միջոցների - Շինարարական սարքավորումներ	Շինարարական հրապարակ	Գործունեության ստուգում	Շինարարության ամբողջ ժամանակահատվածում	Նվազեցնել պատահարների հավանականությունները	ՀՏՀՀ Տեխնիկական վերահսկողության կազմակերպություն

	ի շահագործման և պաշտպանիչ համազգեստի օգտագործման կանոնների խիստ պահպանում - աշխատանքի անվտանգության ուսուցման և հրահանգների գրառումների առկայություն - Աշխատանքի վայրում առաջին օգնության բժշկական փաթեթների և կրակմարիչների առկայություն - Արտակարգ իրավիճակների ծառայությունների (բժշկական, հրդեհային) կոնտակտային տվյալներ, որոնք տեղադրված են աշխատանքային վայրի տեղեկատվական տախտակին					
7. Հողային աշխատանքներ	-Հողի վերին շերտի վերամշակման համար հողի հեռացում և ժամանակավոր պահեստավորում - Պեղված հողի	Շինհրապարակ	Գործողությունների զննում	Հողային աշխատաքների ընթացքում	Բուսականության կորստի սահմանափակում հողային աշխատանքների արդյունքում և մասնիկներով վերգետնյա ջրամբարների աղտոտումը նվազագյունի հասցնել Նվազեցնել ստորգետնյա և վերգետնյա ջրերի աղտոտումը	ՀՏՀՀ ՏՎԿ

	ժամանակակից պահպանումը որոշված վայրերում. - Անհրաժեշտության դեպքում պեղված հողի պահպանում և ավելցուկային զանգվածը գրավոր հաստատված վայրեր տեղափոխություն				հողով:	
8. Իներտ նյութերի արդյունահանում	- գոյություն ունեցող մատակարարներ ից իներտ նյութերի գնում, եթե այդպիսի հնարավորություն կա - իներտ նյութերի արտադրության լիցենզիայի ստացում և լիցենզիայի խիստ համապատասխանություն - քարհանքերի տեռասավորում, շահագործվող տարածքների վերալիցքավորում և լանդշաֆտի հետ	Իներտ նյութերի քարհանքեր	Փաստաթղթերի ստուգում Գործողությունների ստուգում	Քարհանքերում պեղումների և մեկտրացիայի ընթացքում	- Սահմանափակել լանջերի էրոզիան և լանդշաֆտի վնասները - Սահմանափակել գետերի ափերի էրոզիան, ջրի հոսքի կշռված մասնիկներով աղտոտումը և ջրային կյանքի խանգարումը	ՀՏԶՀ Տեխնիկական վերահսկողության կազմակերպություն

	ներդաշնակեցում - ջրի հոսքից դուրս մանրախիճ փորել, ջրի հոսքի և պեղումների տարածքի միջև լեռնաշղթաները բաժանելու կազմակերպում, տրանսպորտային միջոցների և մեքենաների կողմից դեպի ջրային ռեսուրսներ մուտքի արգելում					
9. Պատահական գտածոներ	- Աշխատանքների դադարեցում՝ անմիջապես փոփոխության գտածոների բախումից հետո. - Պաշտոնական հաղորդակցություն ն ՀՀ հուշարձանների և պատմական վայրերի պաշտպանության գործակալության հետ ՝պատահական գտածոների հետ. - Անհրաժեշտ պեղումների և տեղանքների պահպանման ուղղությամբ	Շինհրապարակ	- Պատահական գտածոների գնում. - Ներկայացված փաստաթղթերի ստուգում	Շինարարության ամբողջ ընթացքում	Համոզվել, որ մշակութային հուշարձանը չի վնասվել շինարարական աշխատանքների ընթացքում	ՀՏՁՀ ՏՎԿ Հուշարձանների և պատմական վայրերի պաշտպանության գործակալություն

	ձեռնարկված ժամանակին պայմանավորված ուլթյուններ					
10. Պատրաստվածու թյունը COVID-19-ին շինարարական հրապարակում	- Աշխատատեղում ձեռքի լվացման միջոցների ապահովում՝ հոսող ջրի, ձեռքի օճառի, ձեռքի ալկոհոլային հիմքով մաքրող միջոցների և ձեռքի չորացման սարքերով բավարար պաշարներով - Աշխատավայրի մուտքի կարգի սահմանում և բժշկական ստուգումները - Ընդհանուր օգտագործման սենյակների, զուգարանների, սարքավորումներ ի, գործիքների և թափոնների կանոնավոր ախտահանում; - Աշխատանքային պրակտիկա աշխատողների միջև շփումը նվազեցնելու կամ նվազագույնի հասցնելու համար - Դիմակների և այլ	Շինարարարակ ան հրապարակ	Գործողությունն երի վերհսկում	Աշխատանքների ամբողջ ընթացքում	Նվազեցնել COVID-19 համավարակի ռիսկերը շինարարական հրապարակում	ՀՏՀՀ Տեխնիկական վերահսկողության կազմակերպություն

	համապատասխան անվտանգության միջոցների տրամադրում ծրագրի բոլոր աշխատողներին՝ շինարարական հրապարակի մոտքի մոտ:					
11. Շինհրապարակների վերամշակումը և կանաչապատումը	Անհրաժեշտությամբ դեպքում, շինհրապարակի և մշտական մոտքի ճանապարհների և տարածքի կանաչապատում և ավարտական մաքրում	Շինհրապարակ և մոտքի ճանապարհներ	Ջննում և փորձաքննություն	Շինարարության վերջնական փուլում	Նվազագույնի հասցնել լանդշաֆտի գեղագիտական արժեքի կորուստը շինարարական գործունեության արդյունքում	ՀՏՀՀ Տեխնիկական վերահսկողության կազմակերպություն
12. Գործունեություն մասնավոր սեփականության և այլ գույքի կողքին	- Շինարարական տրանսպորտային միջոցների և մեքենաների կայանման արգելում շինհրապարակից դուրս - Շինհրապարակի շուրջ հետիոտների և տրանսպորտային միջոցների տեղաշարժի արգելք թույլ չտալ՝ շինանյութերի/թա	Մասնավոր սեփականության հարևանությամբ իրականացվող աշխատանքներ	Ջննում և փորձաքննություն	Շինարարության ամբողջ ընթացքում	Նվազեցնել մասնավոր սեփականությանը վնասի հասցման հավանականությունը: Բացառել մասնավոր սեփականության վրա սեփականատիրոջ կամ օգտագործողի իրավունքների ժամանակավոր կամ մշտական խախտումը:	ՀՏՀՀ Տեխնիկական վերահսկողության կազմակերպություն

	փոփոխություններ/թափաման պատճառով - Կապալառուի անձնակազմի կողմից շինհրապարակի շրջակայքում մասնավոր հողատարածքներ ի և/կամ այլ գույքի նկատմամբ ոտնձգություն թույլ չտալ					
13. Բողոքների լուծման մեխանիզմի գործածում	Ենթադրագրի վերաբերյալ բողոքների կամ հարցերի վերաբերյալ հանրային իրավունք: Դիմում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարին (համայնքային իշխանություններին): Բողոքների համակարգողի նշանակում (բողոքների ստացում, վերանայում և բացատրություն, բողոքների	Շին հրապարակ	Փորձաքննություն	Շինարարության ամբողջ ընթացքում	Բողոքի քննարկում և լուծում 2 շաբաթվա ընթացքում: Խնդրի լուծման ձախողման դեպքում նախարարության կամ իրականացնող կազմակերպության մակարդակում, ԾԱԵԱ-ն կարող է դիմել դատարանին որոշման կայացման համար՝ ՀՀ օրենսդրության համաձայն	ՀՏՀՀ Տեխնիկական վերահսկողության կազմակերպություն


	գրանցքում մատչանում և փորձ լուծել դրանք ոտքի վրա): Բողոքատուն կարող է դիմել անմիջապես <ՏՀՀ՝ թեժ գիծ ծառայության (010 24 01 59), փոստային նամակի (Երևան 0037, Կ. Ուլենցի 31), էլեկտրոնային նամակի (support@atdf.am). կամ <ՏՀՀ-ի կայքում տեղադրված գործիքի միջոցով (http://atdf.am/hy/ Home/ContactUs):					
--	---	--	--	--	--	--

ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՓՈԽԼ

1. Կեղտաջրերի հավաքման և մաքրման միավորի շահագործում և սպասարկում	- Կեղտաջրերի արտահոսք կոյուղու սխեմայից - Կեղտաջրերի մաքրման միավորի անխափան	Կեղտաջրերի սխեման և տեղադրված մաքրման կայան	Մաքրված կոյուղաջրերի գործիքային որակի փորձարկում՝ համաձայն	Շահագործման ընթացքում	Կանխարգելել ջրով փոխանցվող հիվանդություններ ըն	Եղեգնաձորի վարչական գրասենյակ «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ
--	--	--	---	-----------------------	--	---

	շահագործում		հաստատված անվտանգությա ն պարամետրերի		Կանխել մակերեսային և ստորերկրյա ջրերի, հողերի աղտոտումը	
--	-------------	--	---	--	---	--

Հավելված 1՝ Լուսանկարներ և քարտեզներ

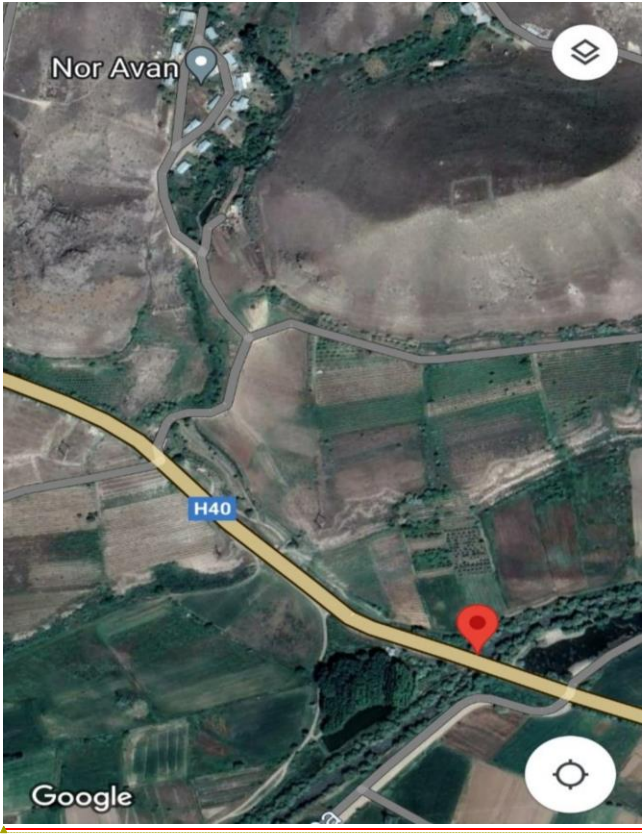

Formatted: Font: (Default) +Body (Calibri), 12 pt, Bold





Հավելված 2՝ Թափոնների հեռացման համաձայնության պատճեն


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶ
ԵՂԵԳՆԱՁՈՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց Ձորի մարզի Եղեգնաձոր համայնք,
ք.Եղեգնաձոր, Շահումյան 1, Հեռ. +374 281
22020, 28125183, yeghegnadzor.vayotszor@mta.gov.am, yeghegnadzor@gmail.com
N 1029
18 հոկտեմբեր 2022 թ.

Տեղեկանք

Տրվում է առ այն, որ Եղեգնաձորի «Նոր Ավան թաղամասի կոյուղու ցանցի և բիոմաջրման կայանի կառուցում» միկրոծրագրով նախատեսված շինարարական աշխատանքների իրականացման ընթացքում առաջացած շինարարական աղբը տեղափոխվելու է քաղաքային աղբավայր, որը գտնվում է շինարարական հրապարակից 600-800մ. հեռավորության վրա:

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԳՆԱԿԱՐ  **ԴԱՎԻԹ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ**



Կառ. թափոնի սեր-գլխավոր ճարտարապետ
Արմեն Արսլանյան
0281-2-20-20

Հավելված 3՝ Համայնքի ղեկավարի գրությունը հողերի կարգավիճակի վերաբերյալ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶ ԵՂԵԳՆԱԶՈՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ	
Հայաստանի Հանրապետության Վայոց Ձորի մարզի Եղեգնաձոր համայնք, ք.Եղեգնաձոր, Շահումյան 1, Հեռ. +374 281 22020,28125183, yeghegnadzor.vayotszor@mta.gov.am,yeghegnadzor@gmail.com N 2088 18 հոկտեմբեր 2022 թ.	
Տեղեկանք	
Տրվում է առ այն, որ «Նոր Ավան թաղամասի կոյուղու ցանցի և բիոմաքրման կայանի կառուցում» միկրոծրագրի նախագծով նախատեսված շինարարական աշխատանքները իրականացվելու են բացառապես համայնքային հողատարածքների վրա, և նախագծված խողովակաշարի ուղեծիրը չի հատում որևէ մասնավոր կամ վարձակալությամբ տրված հողատարածք:	
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝	ԴԱՎԻԹ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
Կարգ. բաժնի պետ-գլխավոր ճարտարապետ Արմեն Արսլանյան 0281-2-20-20	

Հավելված 5՝ Հանրային քննարկման արձանագրություն

2022 թվականի դեկտեմբերի 22-ին Եղեգնաձորի վարչական գրասենյակի շենքում տեղի ունեցավ հանրային քննարկում՝ ՀՏՀ-ի, Եղեգնաձորի քաղաքապետարանի ներկայացուցիչների և Նոր Ավան բնակավայրի բնակիչների մասնակցությամբ: Ընդհանուր առմամբ հանդիպմանը մասնակցել է 14 մարդ, որից 5-ը կանայք են:

Հանրային խորհրդակցության հայտարարությունը հրապարակվել է ՀՏՀ և համայնքի վեբ էջում և Եղեգնաձոր համայնքի ֆեյսբուքյան էջում 2022 թվականի դեկտեմբերի 14-ին:

Հանդիպումը բացեց Եղեգնաձորի համայնքապետ Դավիթ Հարությունյանը և ներկայացրեց հանդիպման նպատակը և միկրոձրագրի հայեցակարգը:

ՀՏՀ բնապահպանության մասնագետ Ասյա Օսիպովան ներկայացրեց միկրոձրագրի շրջանակներում իրականացվելիք շինարարական աշխատանքների շրջանակը և մշակված ԲՍԿՊ-ի նպատակը:

Ասյա Օսիպովան ներկայացրեց ակնկալվող բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունները, ներառյալ շինարարական աշխատանքների արդյունքում գոյացած շինարարական աղբի տեղափոխումը, աղմուկի և փոշու առաջացումը: Ներկայացվել են նաև նախատեսվելիք անվտանգության միջոցառումները՝ ներառյալ շինհրապարակի ցանկապատումը, շինհրապարակի վտանգավոր հատվածներում զգուշացնող ժապավենների տեղադրումը և երթևեկության կառավարումը, ինչպես նաև անվտանգության նշանների տեղադրման պահանջները: Ներկայացվել են աշխատանքի անվտանգության միջոցառումները, այդ թվում՝ համազգեստ առկայությունը և անհատական պաշտպանության միջոցները, ինչպես նաև շինանյութերի մատակարարման և շինարարական սարքավորումների պահպանման պահանջները: Արվիա գետի աղտոտումից խուսափելու համար անհրաժեշտ է նաև անվտանգության լրացուցիչ միջոցառումներ իրականացնել:

Հանդիպման մասնակիցներին ներկայացվեց ՍՆՏՀ ծրագրի Բողոքների լուծման մեխանիզմը (ԲԼՄ): Ներկայացվեցին համայնքի ժողովում ընտրված տեղական համակարգողի (Արմեն Աղաջանյանի) կոնտակտային տվյալները: Ներկայացվել են բողոքների ներկայացման, քննության և վերանայման ընթացակարգերը: Նշվեց, որ ԲԼՄ-ի մասին տեղեկատվությունը լրացուցիչ կտեղադրվի Եղեգնաձորի վարչական գրասենյակի տեղեկատվական տախտակին, իսկ միկրոձրագրի տեղեկատվական տախտակը պետք է տեղադրվի շինհրապարակի մուտքի մոտ:

Ասյա Օսիպովան պատմել է ԲՍԿՊ-ով նախատեսված միջոցառումների իրականացման վերահսկողության և մոնիտորինգի ընթացակարգերի մասին:

Ա.Օսիպովան համայնքի ղեկավարներից ստացել է տեղեկատվություն, որը հանգեցնում է հետևյալ երկու հարցերի վերաբերյալ պարզաբանումների. նախ, Եղեգնաձոր համայնքի կողմից տրամադրված տեխնիկատնտեսական հիմնավորումը ցույց է տալիս, որ «ՀՀ Վայոց

ծորի մարզի Եղեգնաձոր համայնքի Նոր Ավան թաղամասում կոյուղու ցանցի և կենսաբանական մաքրման կայանների կառուցում» ծրագիրը, որը նախատեսվում է իրականացնել փոխանցվել է «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ին, քանի որ Եղեգնաձոր համայնքը սպասարկում է «Վեոլիա Ջուր»-ը: Այս հանդիպմանը համայնքի ղեկավար Դ.Հարությունյանն ասաց, որ այն բանից հետո, երբ Եղեգնաձոր համայնքը պաշտոնապես ներկայացրել է «Վեոլիա Ջուր» նախագիծը քննարկման և հաստատման, իրենք տվել են դրական պատասխան՝ նշելով, որ դա կլինի հետաքրքիր և նոր փորձ: Երկրորդ, Օսիպովան բարձրացրել է նաև Եղեգնաձորի քաղաքապետարանի կողմից Բնապահպանության նախարարություն այս նախագծով կեղտաջրերը բաց թողնելու թույլտվության դիմումի հարցը: Համայնքի ղեկավար Դ.Հարությունյանն ասաց, որ ծանուցում է ստացել մոտ ժամանակահատվածում պատասխանը ստանալու մասին:

Հավելված 6՝ Շինարարության իրականացման թույլտվություն

N 530 cut/p 20 25 10

[Handwritten signature]

[illegible]

7. Cylindrocarpon destructans (Kühn) Sacc.

Corynebacterium diphtheriae "DPT, w/lyt phage"

Հ) առարկայի Կ (ձև) 5-պայման 2022 թ. N 352-22 փորձագիտական դրական եզրակացություն

1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608

(b) (5) DPP, (b) (5) ACP

2. Եզրապահունակ աշխատանքները կատարեցին: Հ.Ս. Մանուկյան ընթացում:

2.1. Ամբարտաշեն օրենքով շահագործող և այլ անհատներ:

1. Երկրորդական դպրոցի քանակական և որակական ցուցանիշները՝

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុន ធានាជីវិត កម្ពុជា ភ្នំពេញ កម្ពុជា

Տրված խնդրանքի է: Կ. Կ. Կարապետյան Վարդան Մանուկյան

ប្រសិនបើមាន ឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោត: ក្រុមប្រឹក្សាបោះឆ្នោត:

4. Ազգանունը փաստաթղթի փոխդրվելու (ընդգրկելու) N 1 հատվածի 108-րդ կետով նախատեսված (զարգրում) _____

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

1. ամբողջական կապերի համաձայնագրեր:

_____ 6. uym

Իրականում, մարդկի շահագործող մարդկանցիկը
ունի:

(-)- 2,3,4,5-tetrahydro-2H-pyran-2-one

B. *Reproductive upregulation*

7) կառուցապատող, նախքան շինարարությունն սկսելը, ինչպես նաև, դրա ընթացքում, պարտավոր է համալիրը վնասելու փորձնաշտկման համար հասանելիության զալ կառուցապատման հետմանը:

2. Հիմնարկության թույլտվության սահմանված ժամկետներում կատարվաւորումը չավարտելու դեպքում հիմնարկն № 1 հավելվածի 123-129-րդ կետերով սահմանված պատիշանջով:

3) փոքրագույն ՀՈՒՄ համայնքների 84-րդ կնիքով ցանկանված ընդգրկումը առկա թույլատվություն ստիվ է առկա և անհրաժեշտ կարգով հաստատված է մարզապետին կտրել հիման վրա, զորն հաջորդող մեխանիզմները փոխադրված չեն և կնիքը է ապահովել հաստատված փոքր ընդգրկման բուն մեկը և աշխատանքային իրականացման հաջողությունները:

(Ligand) als Ligandengruppe, hier: als Ligandengruppe (Ligandengruppe) i. d. Ligandengruppe

Տեղեկություններ համաձայն 116-րդ հոդվածի սահմանված դեպքերում

[illegible]

Տվյալն են ամփոփագրված կամ մասամբ լրացված ենթադր. դրանց հիման վրա կատարվող, ճշգրտվող մասնագ. հարցախնդրակ. շնորհագրերն են այն:

11/11/23 23:58/

Երաժշտական ոլորտում աշխատողները իրականացնելու նպատակով, նախազգուշացնելու և խնայողականության:

7. Lij van deuren

Copyright © 2004 John Wiley & Sons, Ltd.

8. Հանրաքվեակոչի 2 համարայինը (շումկոմիս, ապագործուածման) աշխատանքներն սկսելուց առնվազն 5 օր առաջ, իսկ մեկը N 6 համարայինը N 2-9 ձևով, տարեկանում է իրավաբան միջոցով:

[illegible]

កម្ពុជា ជាមិត្តរួមរដ្ឋបាល ជាមិត្តរួមក្រសួង ជាមិត្តរួមក្រុមប្រឹក្សា ជាមិត្តរួមក្រុមប្រឹក្សា

ចំណែកនៃការ រៀបចំសេចក្តី ១៤៧៤

ՄԶԻ  Դ. ԳՆՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

